
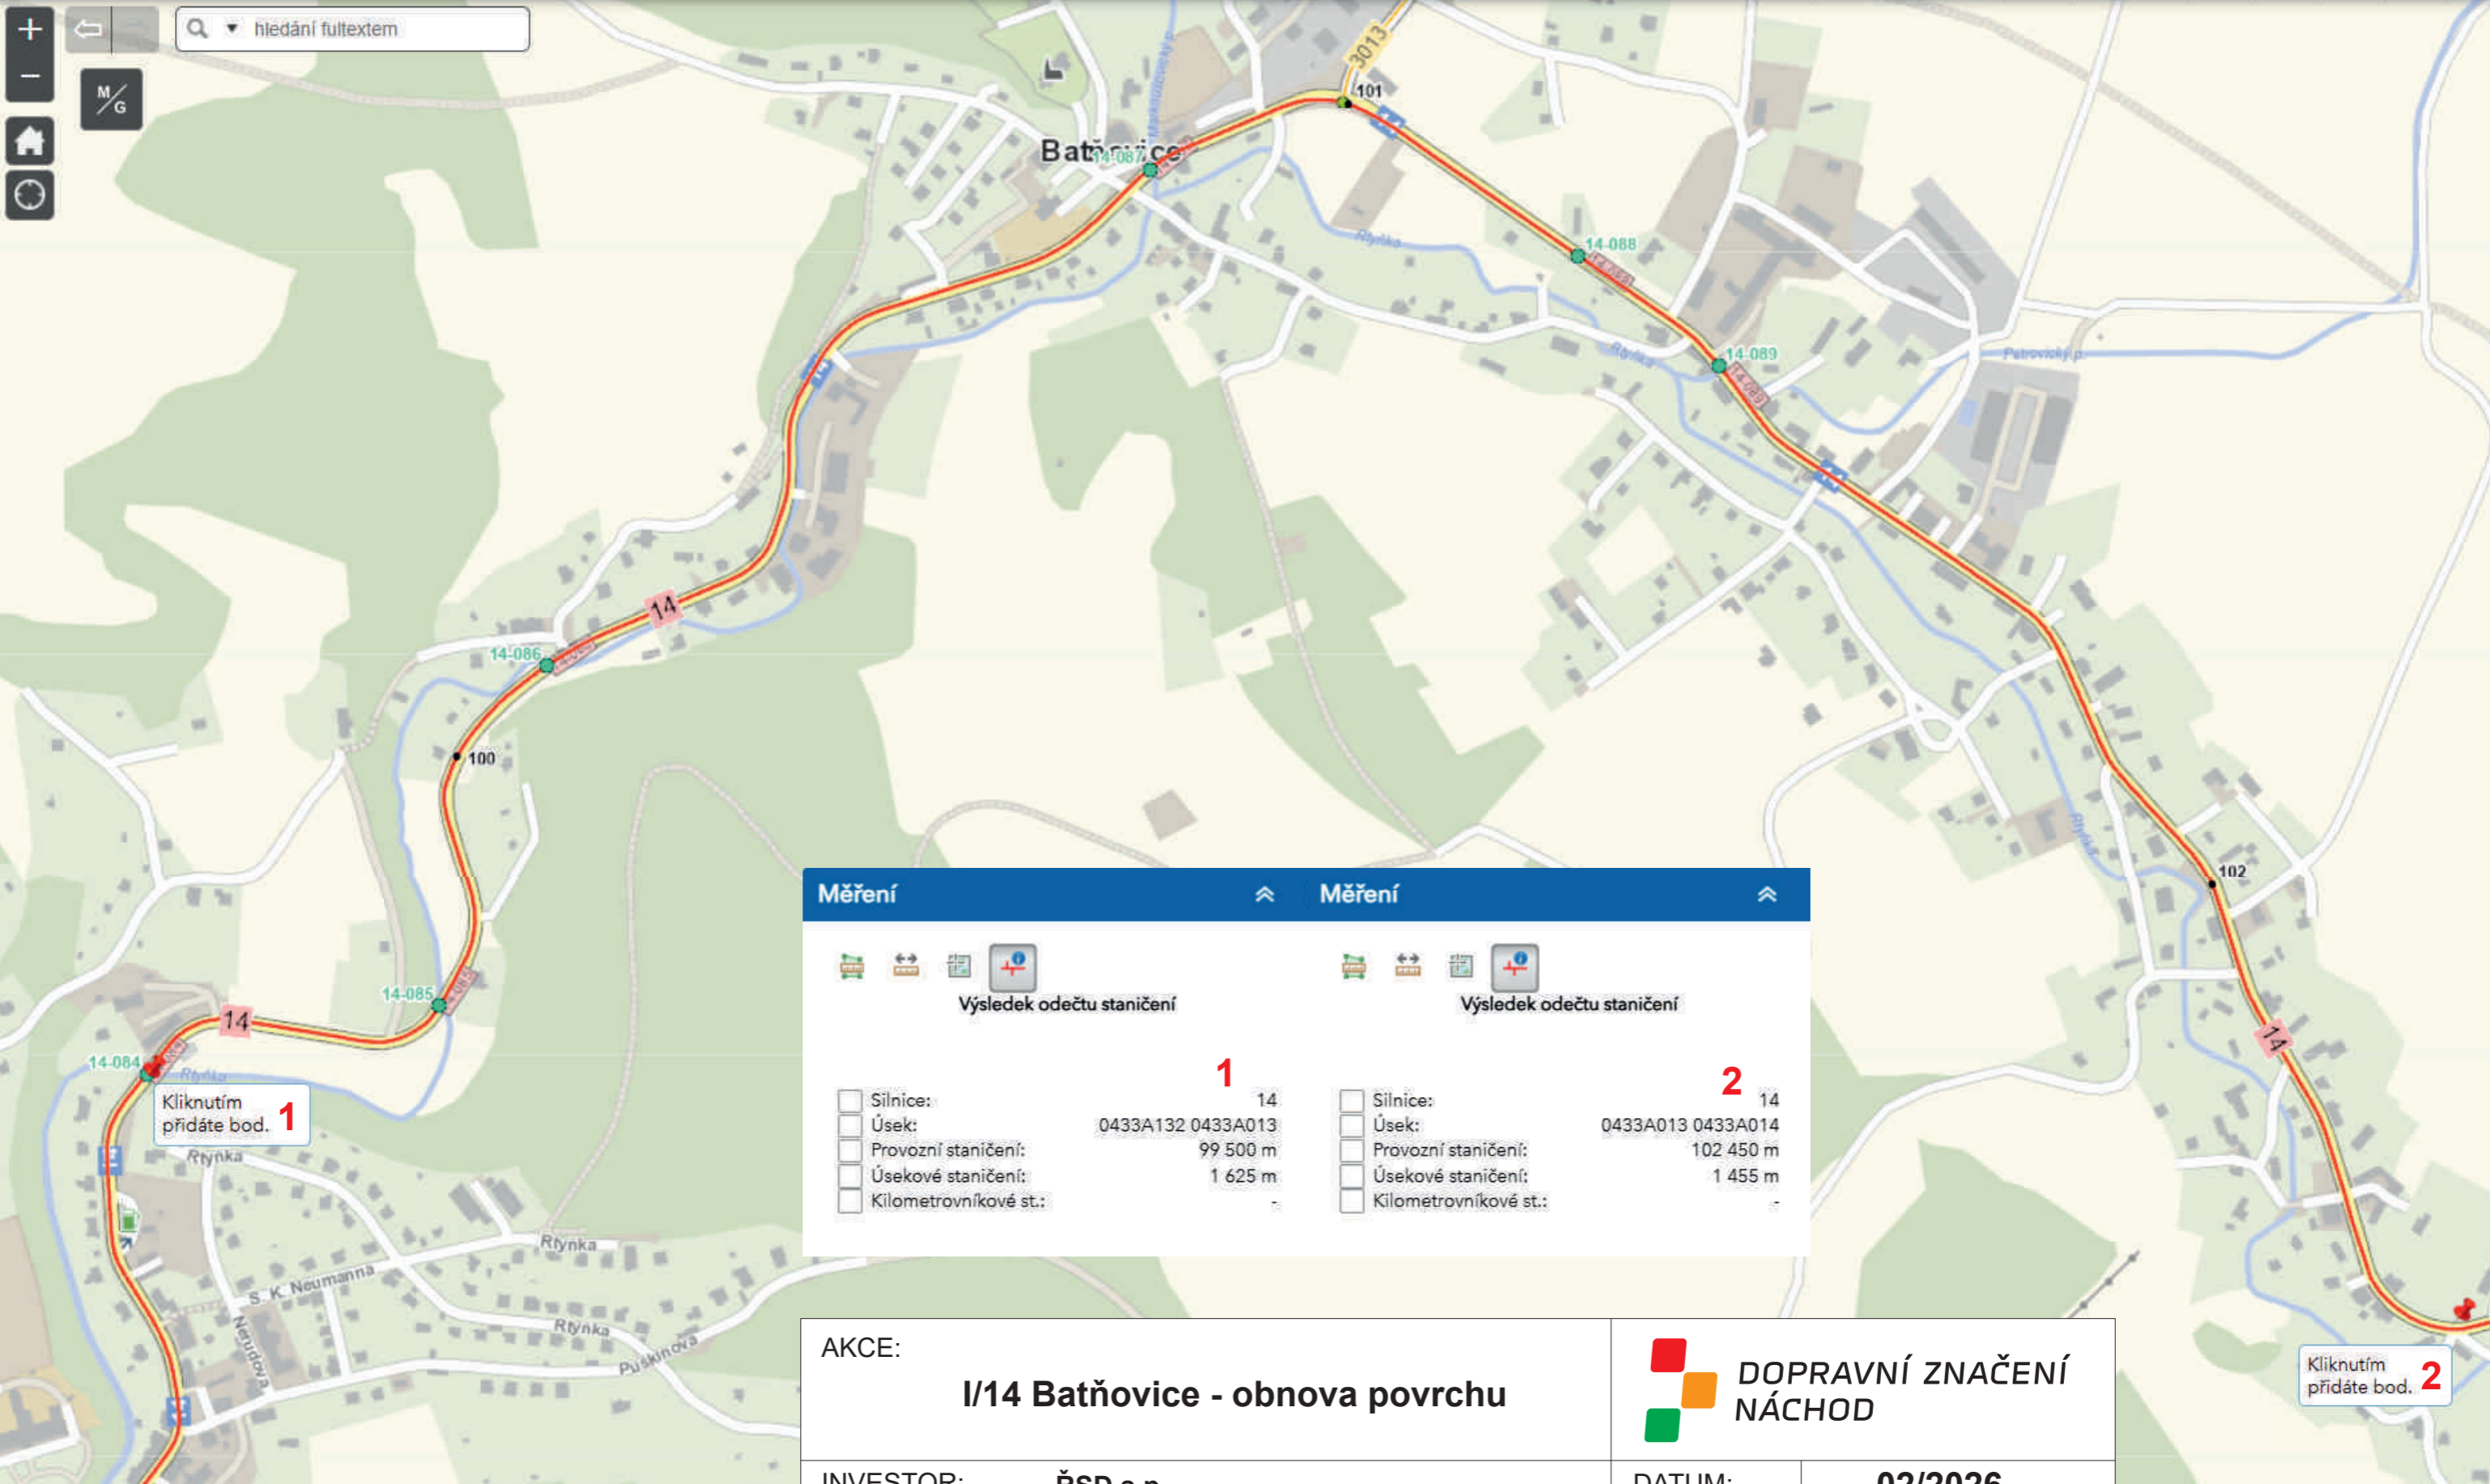


Situace s vyznačením místa stavby

AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


hledání fulltextem




Měření		Měření	
Výsledek odečtu staničení		Výsledek odečtu staničení	
<input type="checkbox"/> Silnice: <input type="checkbox"/> Úsek: <input type="checkbox"/> Provozní staničení: <input type="checkbox"/> Úsekové staničení: <input type="checkbox"/> Kilometrovníkové st.:	1 14 0433A132 0433A013 99 500 m 1 625 m -	<input type="checkbox"/> Silnice: <input type="checkbox"/> Úsek: <input type="checkbox"/> Provozní staničení: <input type="checkbox"/> Úsekové staničení: <input type="checkbox"/> Kilometrovníkové st.:	2 14 0433A013 0433A014 102 450 m 1 455 m -

AKCE:			
I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.		

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice I/14 Batňovice v km provozního staničení cca 99,500 - 102,450

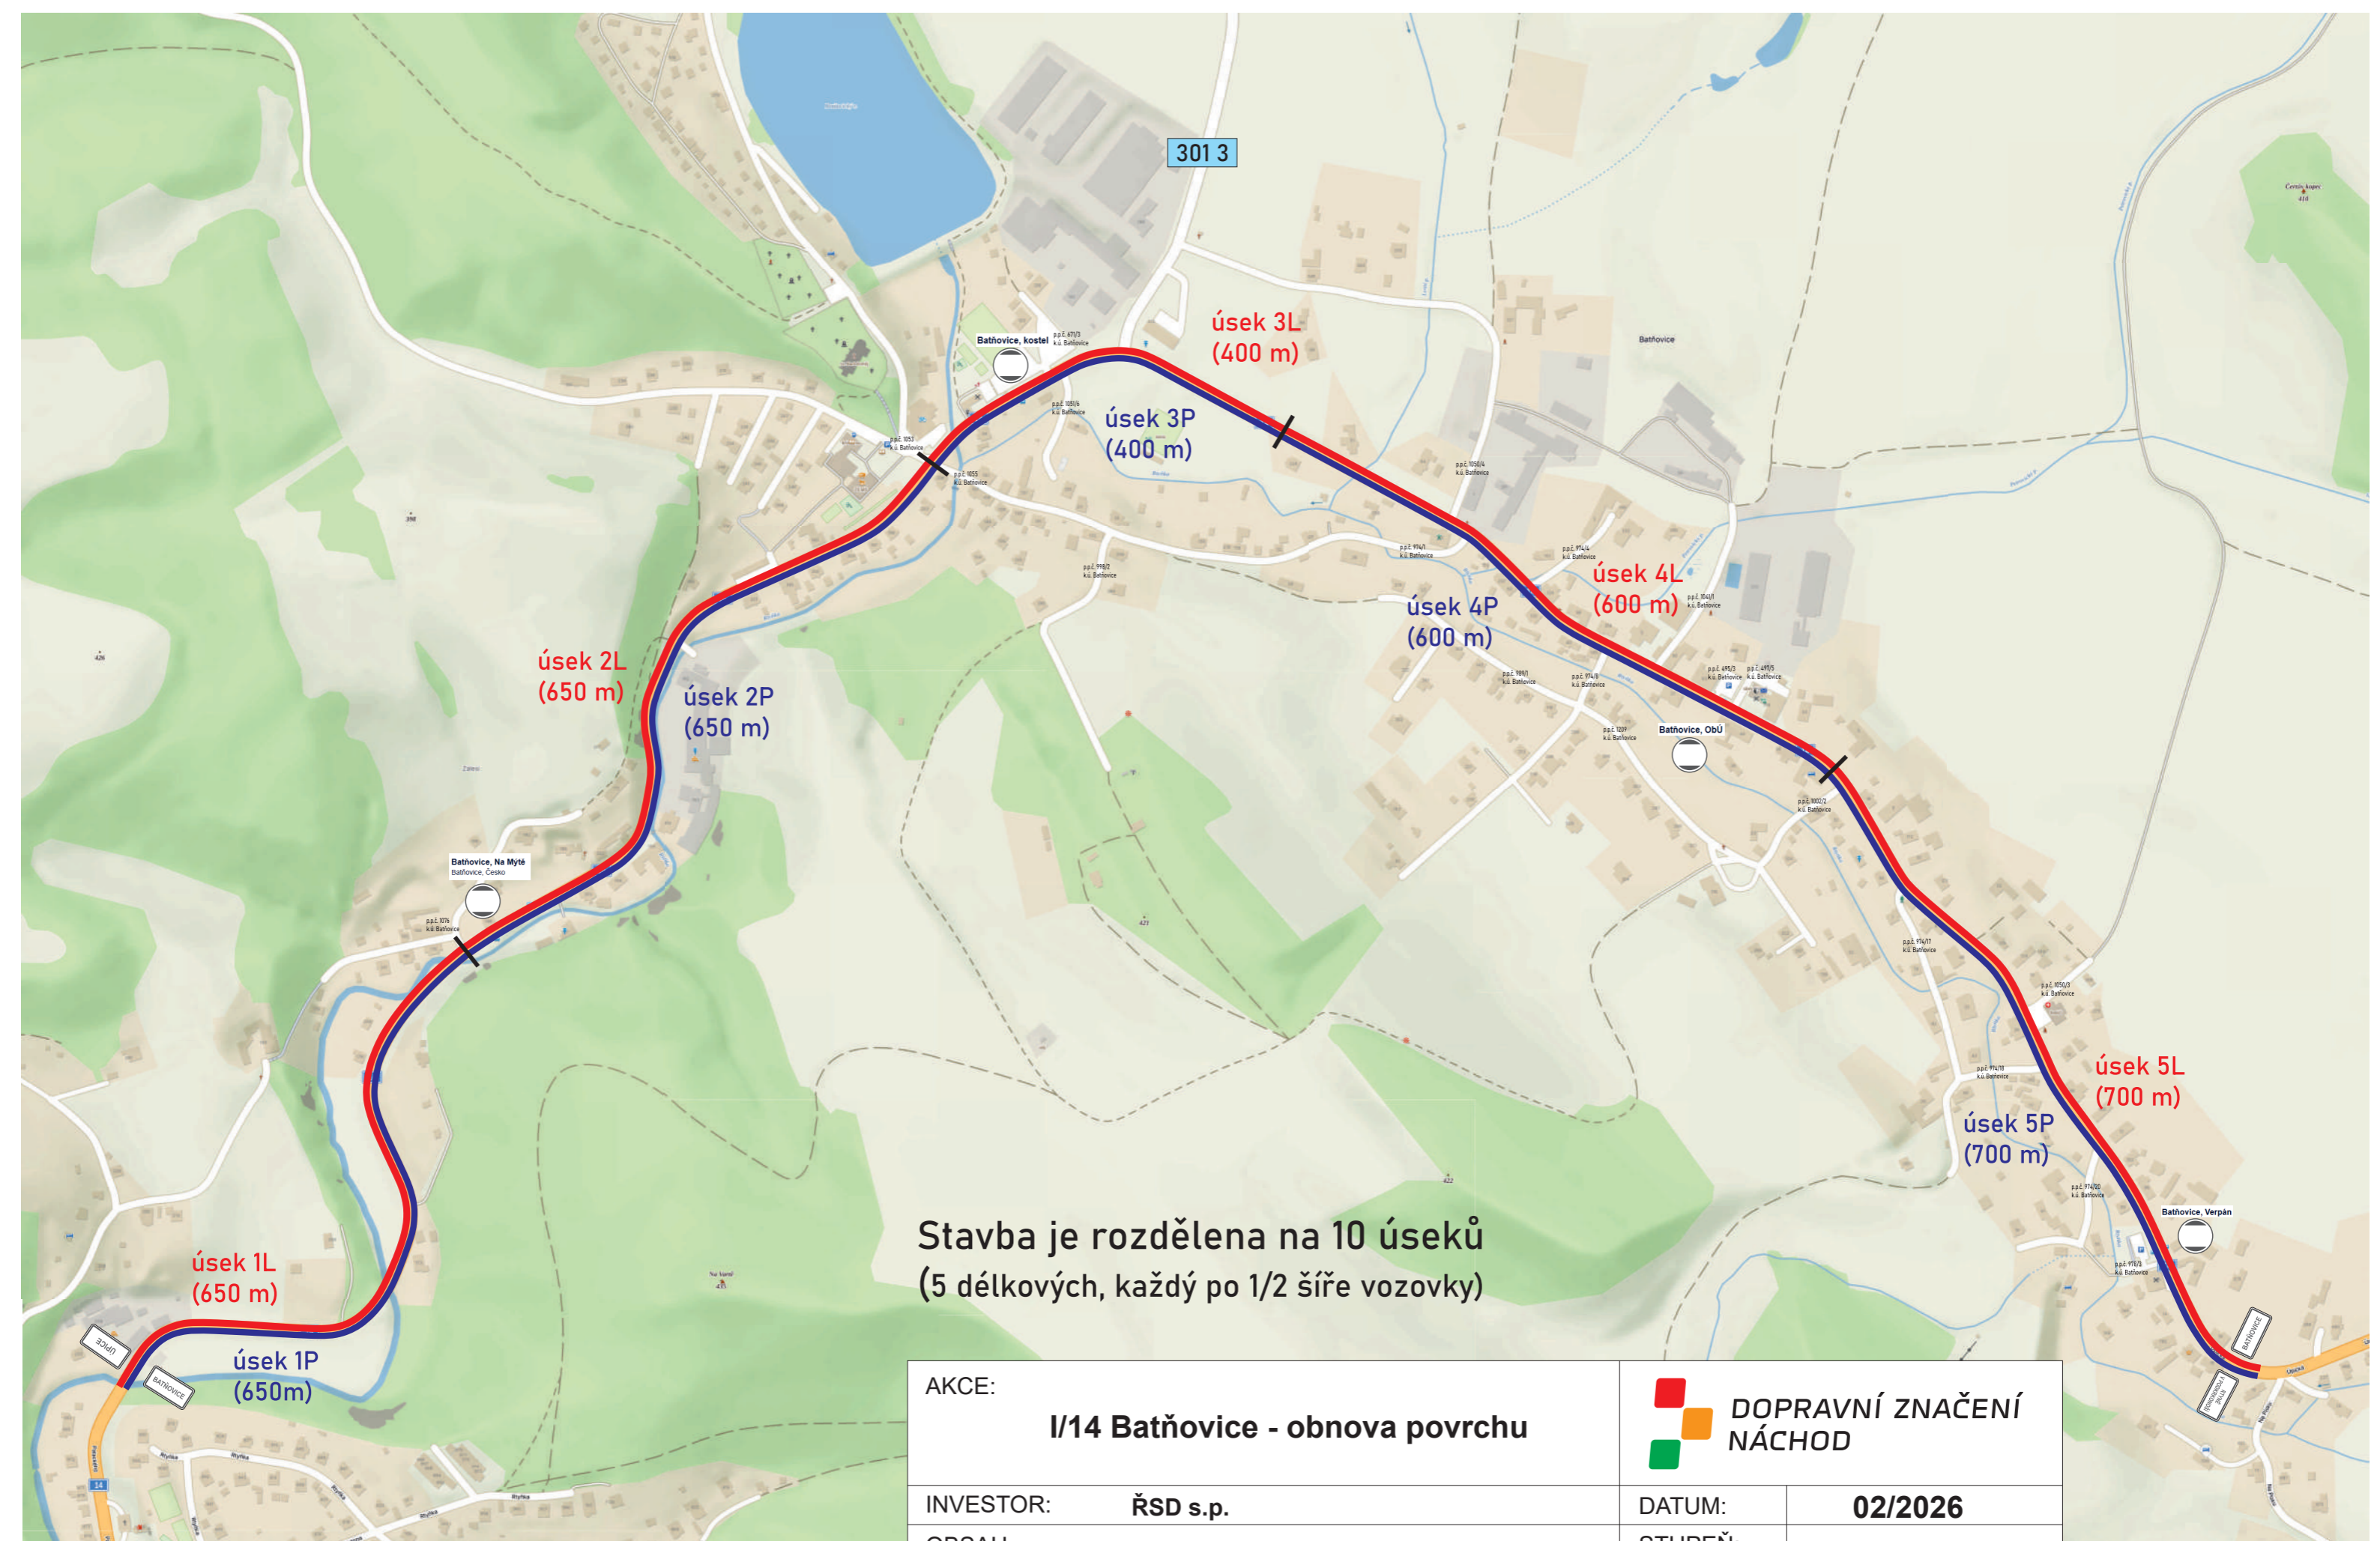


Stavba je rozdělena na 10 úseků
(5 délkových, každý po 1/2 šíře vozovky)


AKCE:		I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026		
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:			
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.				



ÚSEK 1L + 4L

2 dny


odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek + odfrézování pruhu podél přídlažby ve zbývajícím úseku stavby

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne

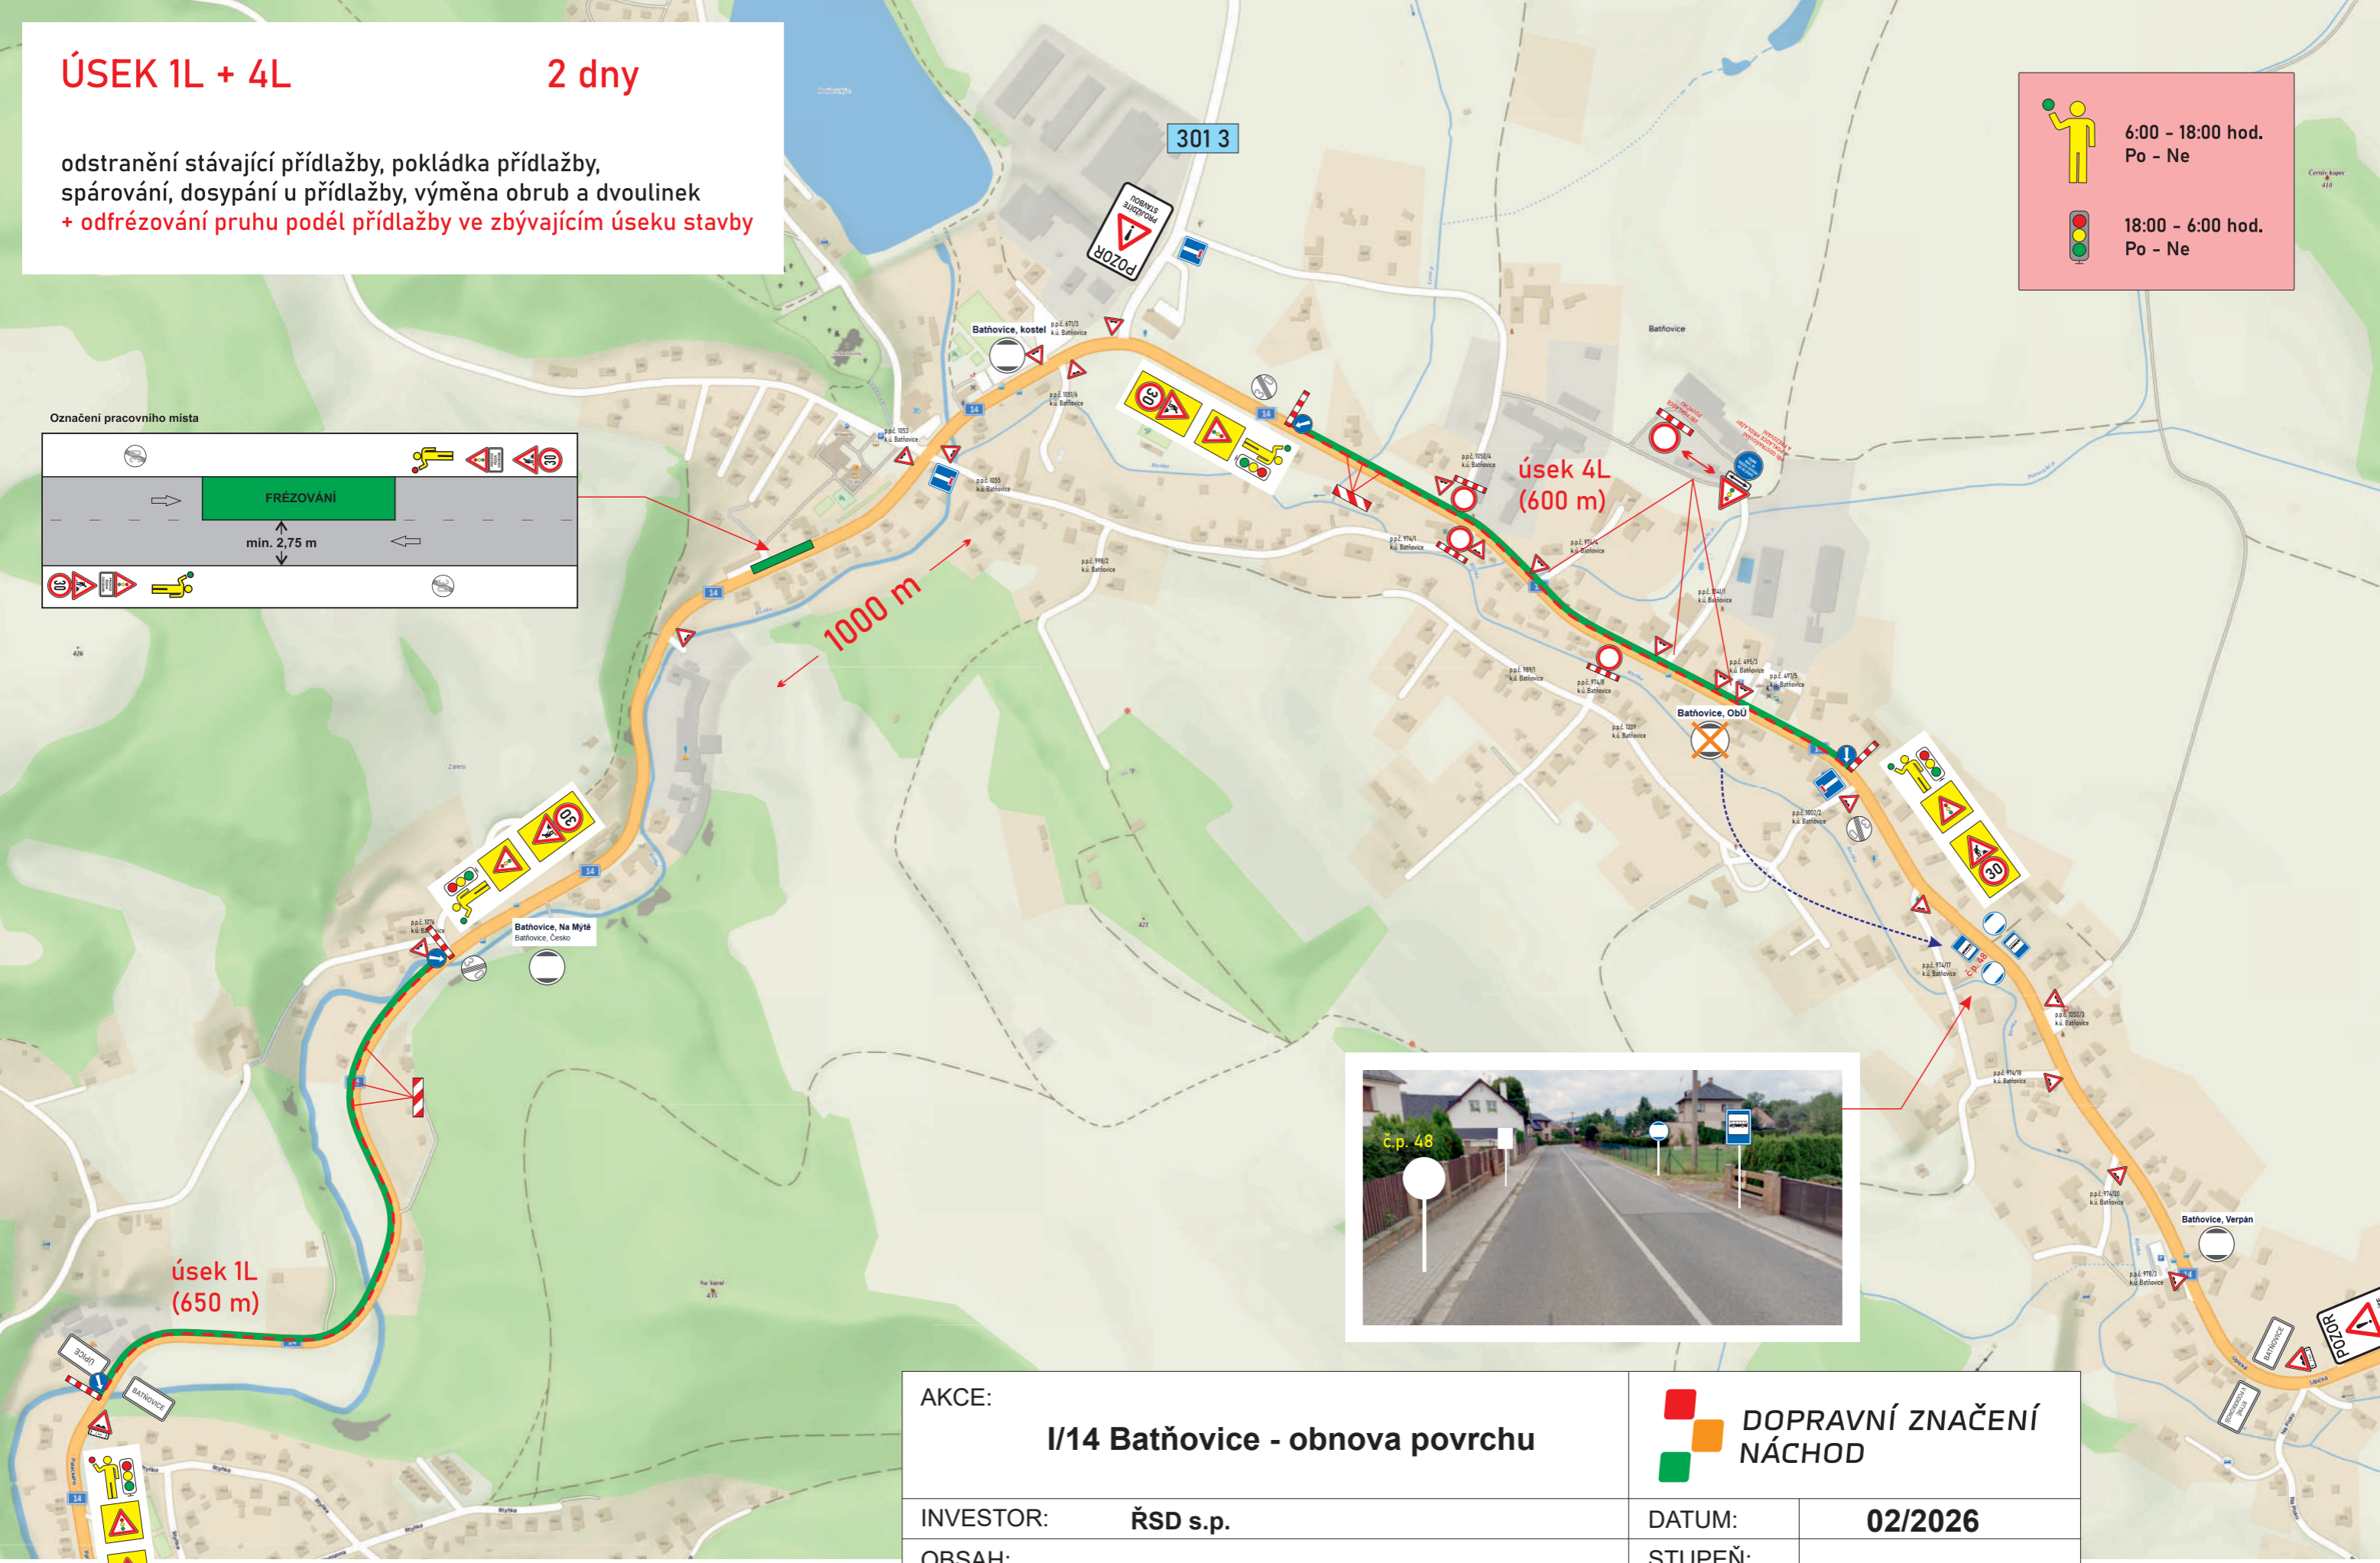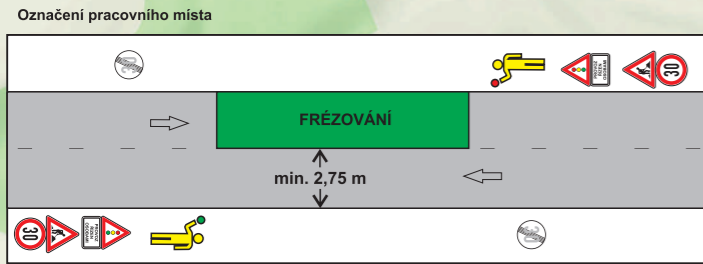

SITUACE PDZ č. 1


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			




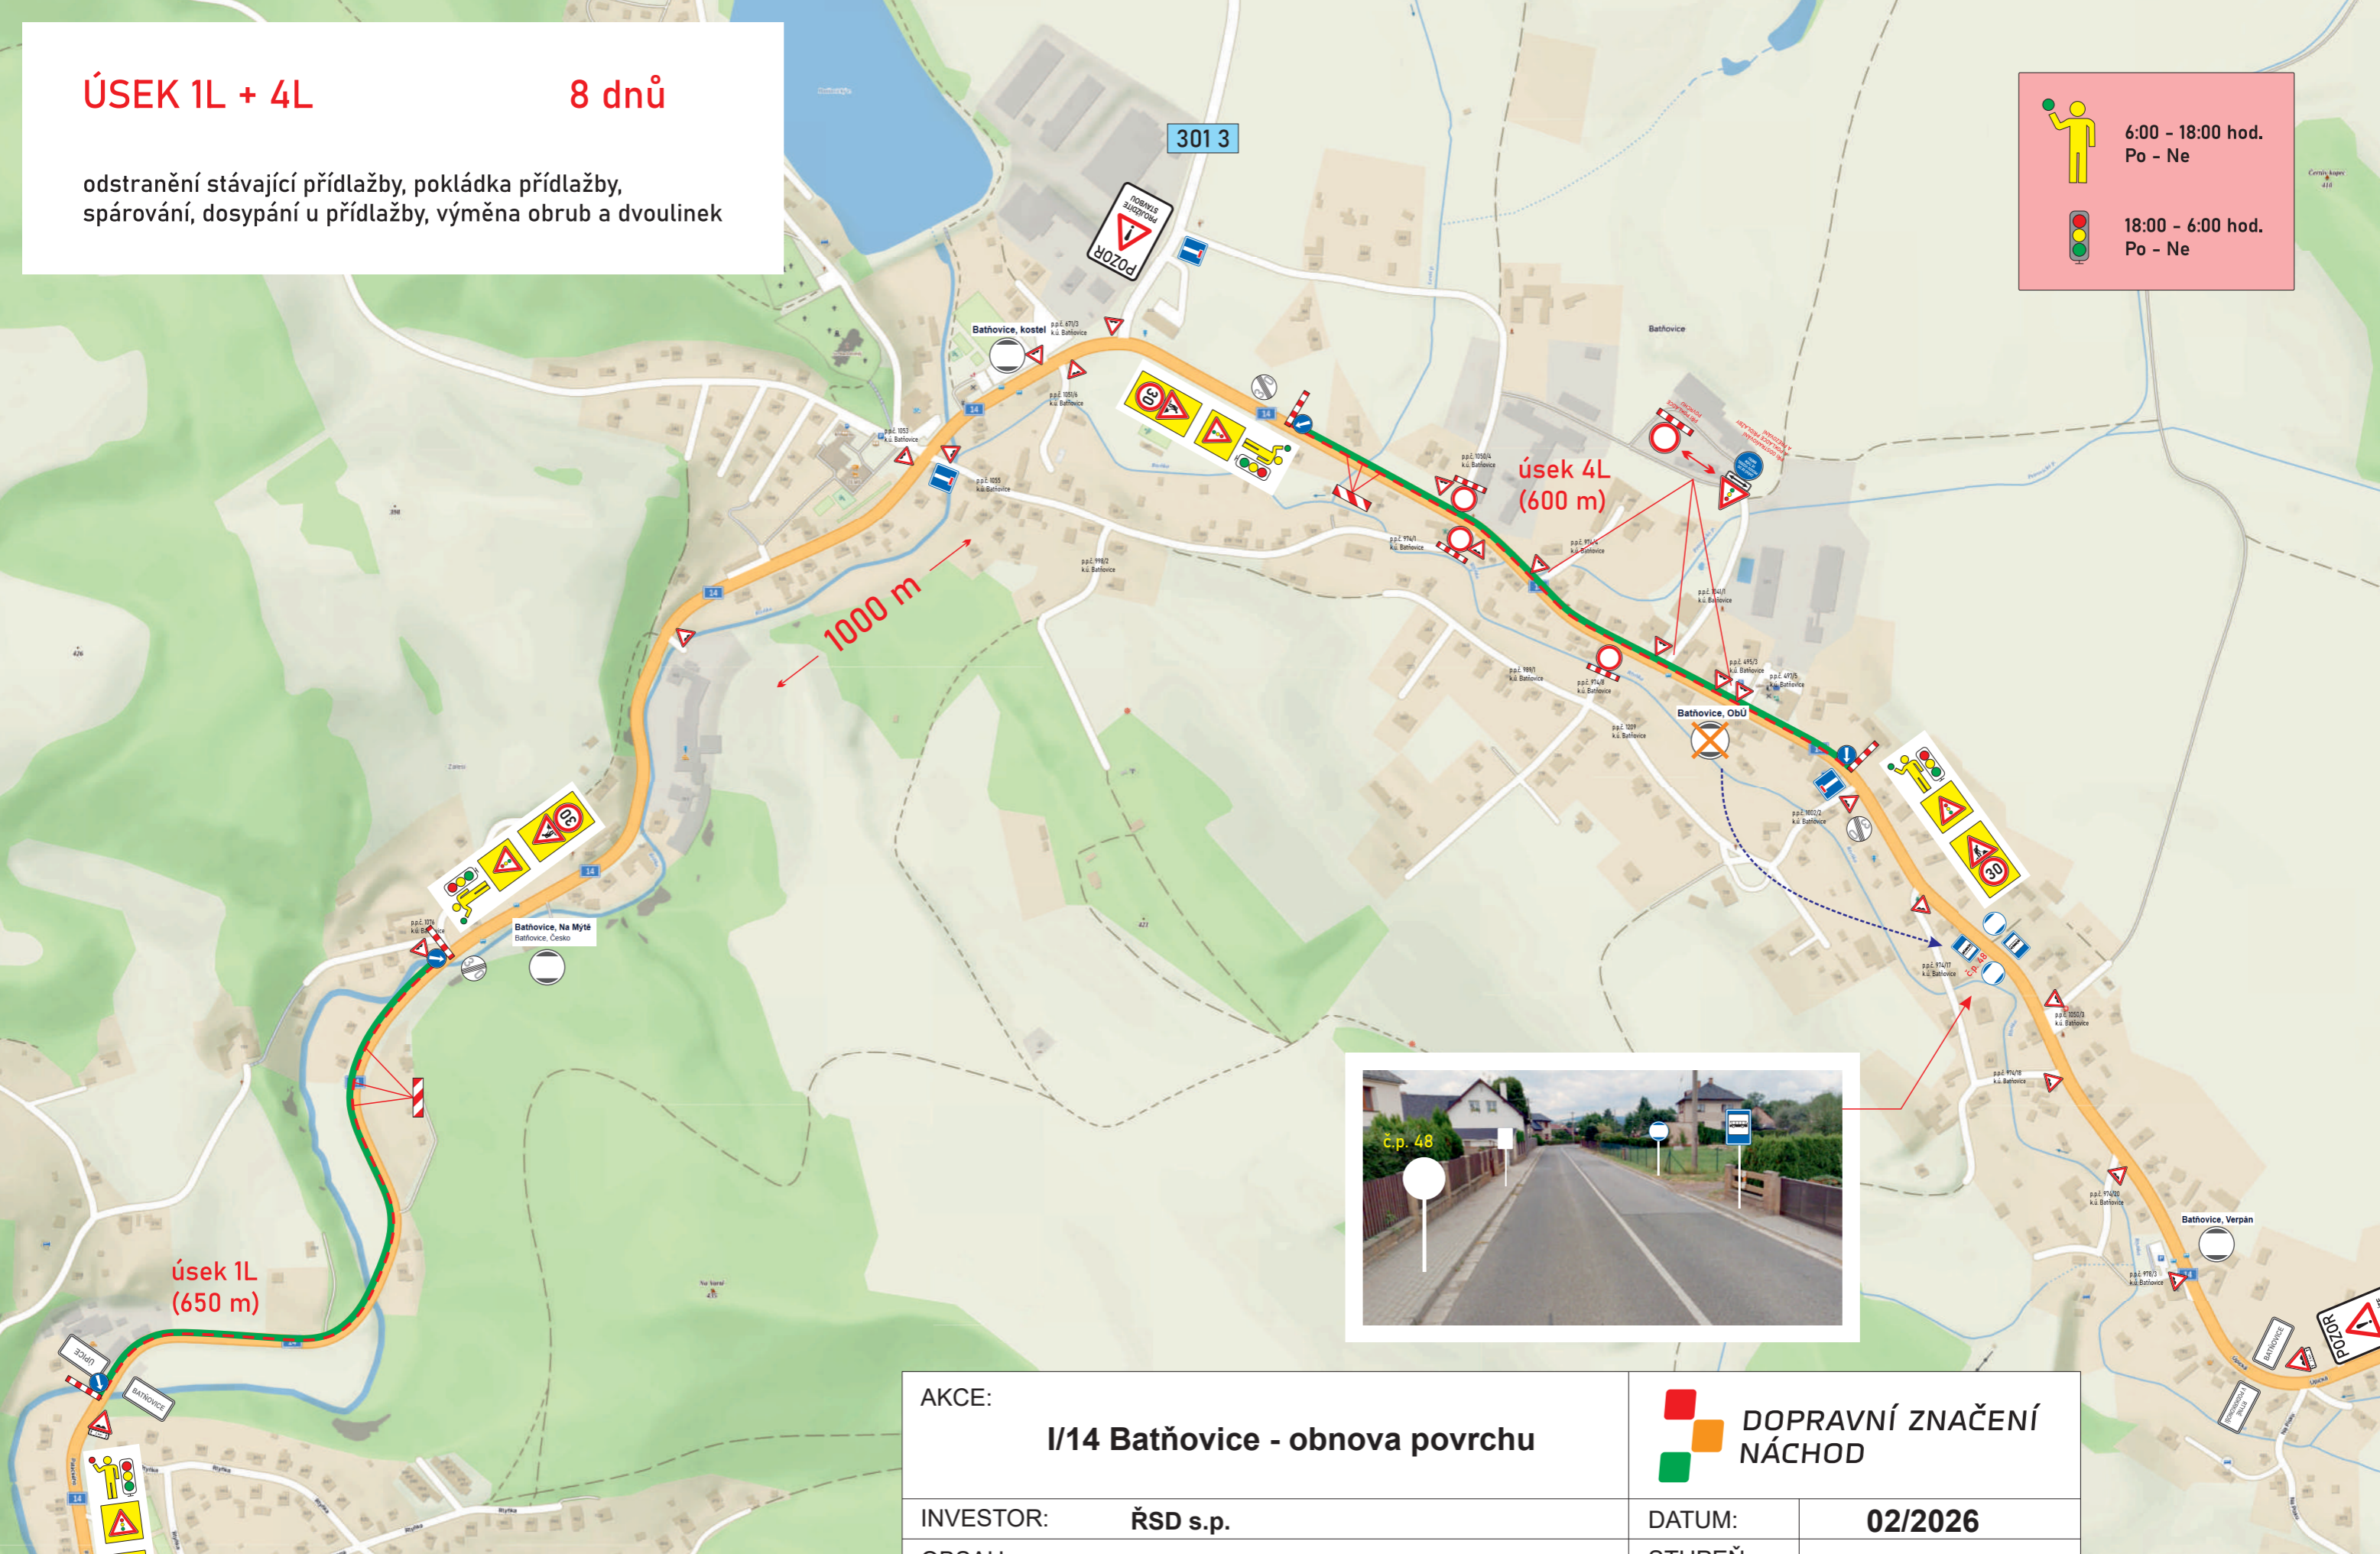
ÚSEK 1L + 4L


8 dnů

odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne



AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


SITUACE PDZ č. 2




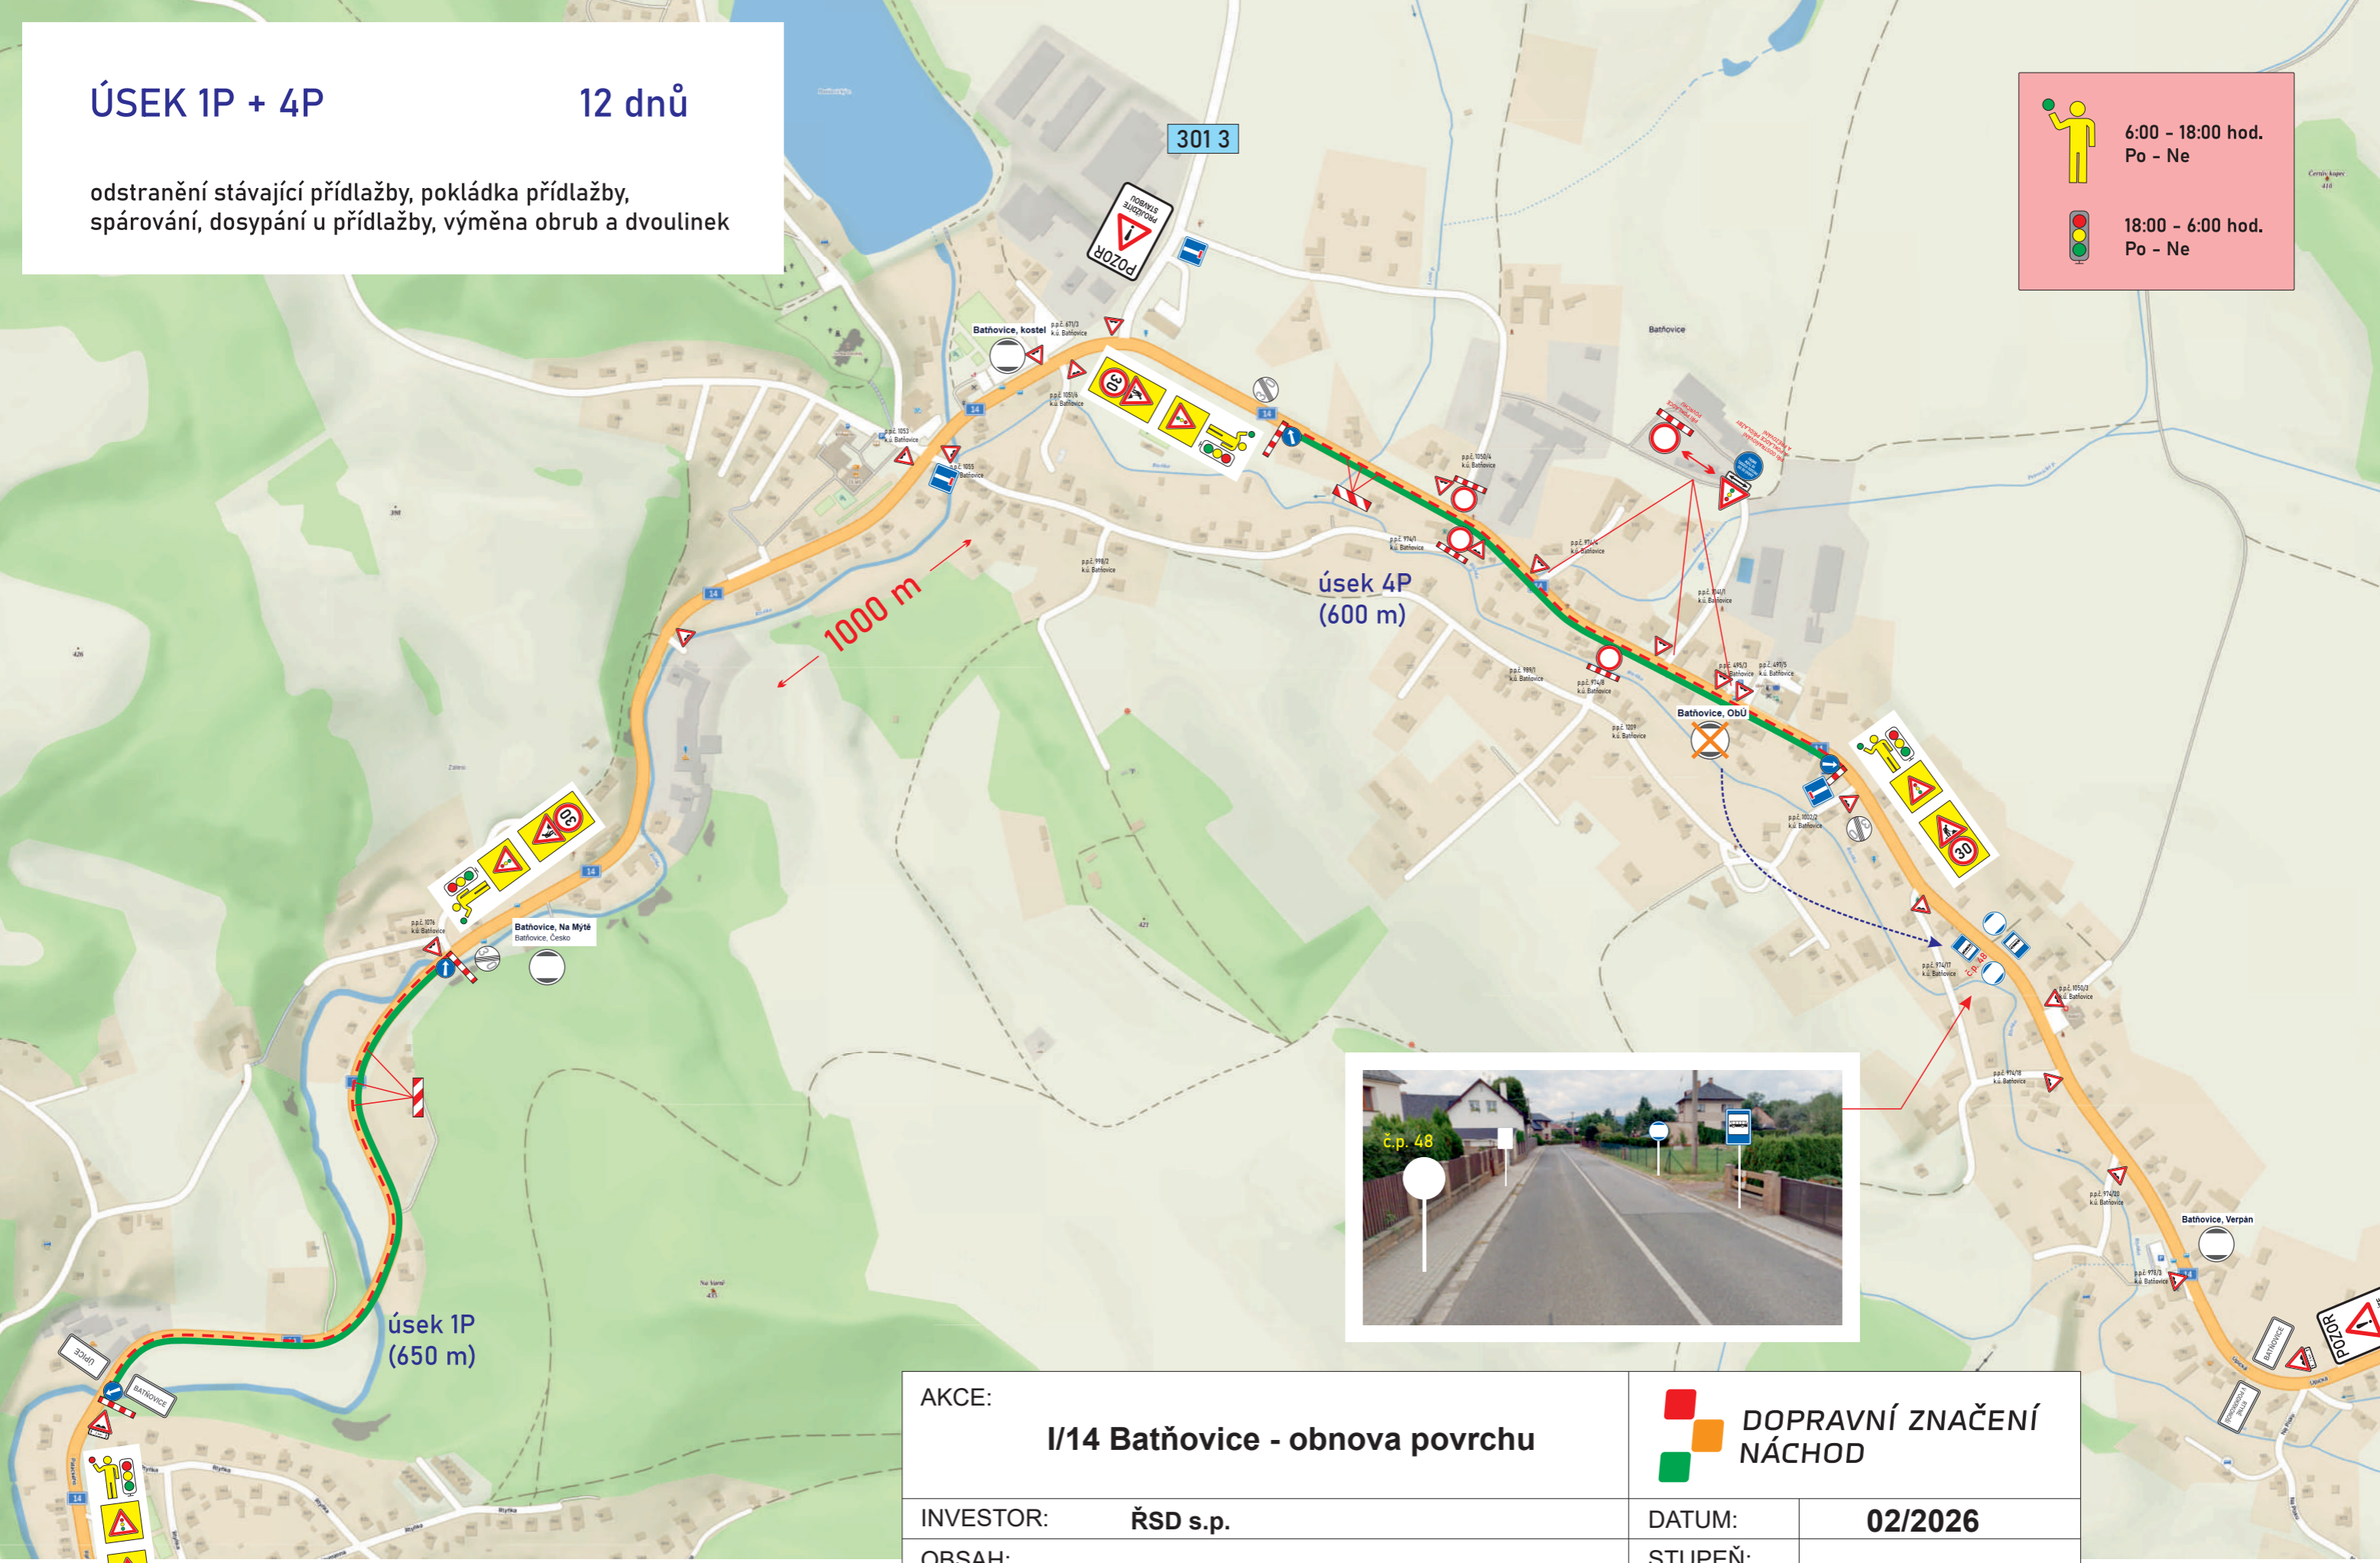
ÚSEK 1P + 4P

12 dnů


odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby,
spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne



SITUACE PDZ č. 3


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:		02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			




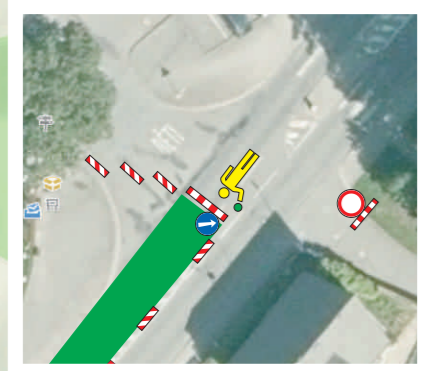
ÚSEK 2L + 5L

11 dnů

odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne




úsek 2L
(650 m)

1000 m

úsek 5L
(700 m)




SITUACE PDZ č. 4


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


ÚSEK 2P + 5P

11 dnů


odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne

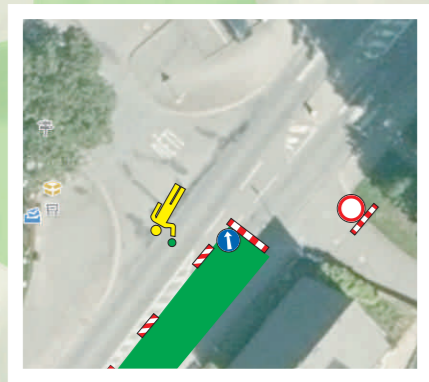


SITUACE PDZ č. 5


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			

ÚSEK 3L

7 dnů


odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne



AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.	


 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
DATUM:	02/2026
STUPEŇ:	


SITUACE PDZ č. 6


ÚSEK 3P


5 dnů

odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne

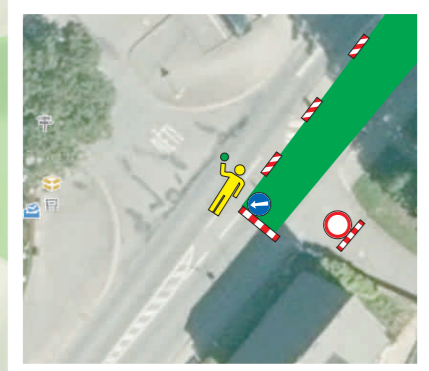


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:		02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


SITUACE PDZ č. 7



ÚSEK 3P


2 dny

odstranění stávající přídlažby, pokládka přídlažby, spárování, dosypání u přídlažby, výměna obrub a dvoulinek
+ celoplošné frézování ve zbývajícím úseku stavby

 6:00 - 18:00 hod.
Po - Ne

 18:00 - 6:00 hod.
Po - Ne

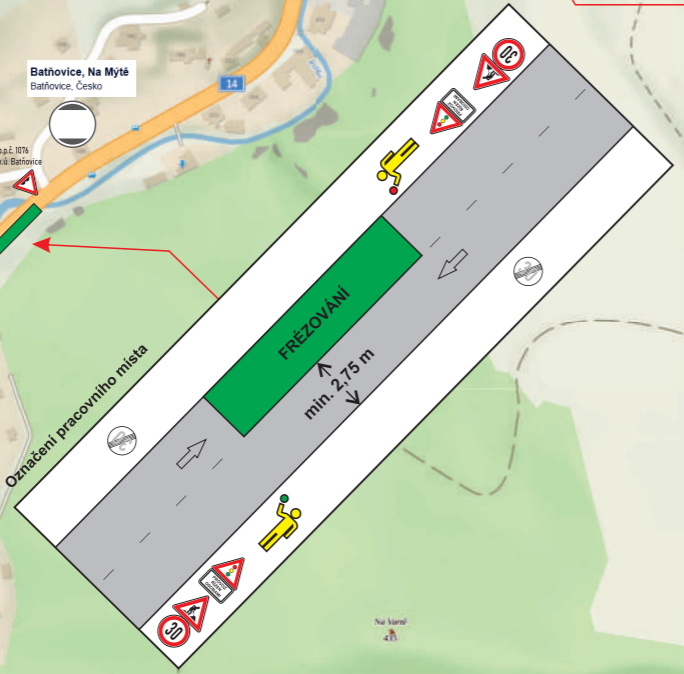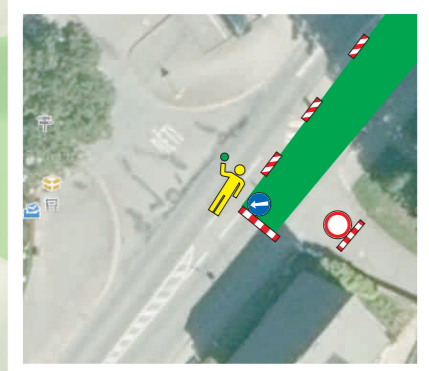


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:		02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


SITUACE PDZ č. 8

CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ 3 dny

+ výšková úprava poklopů (pracovní místa)

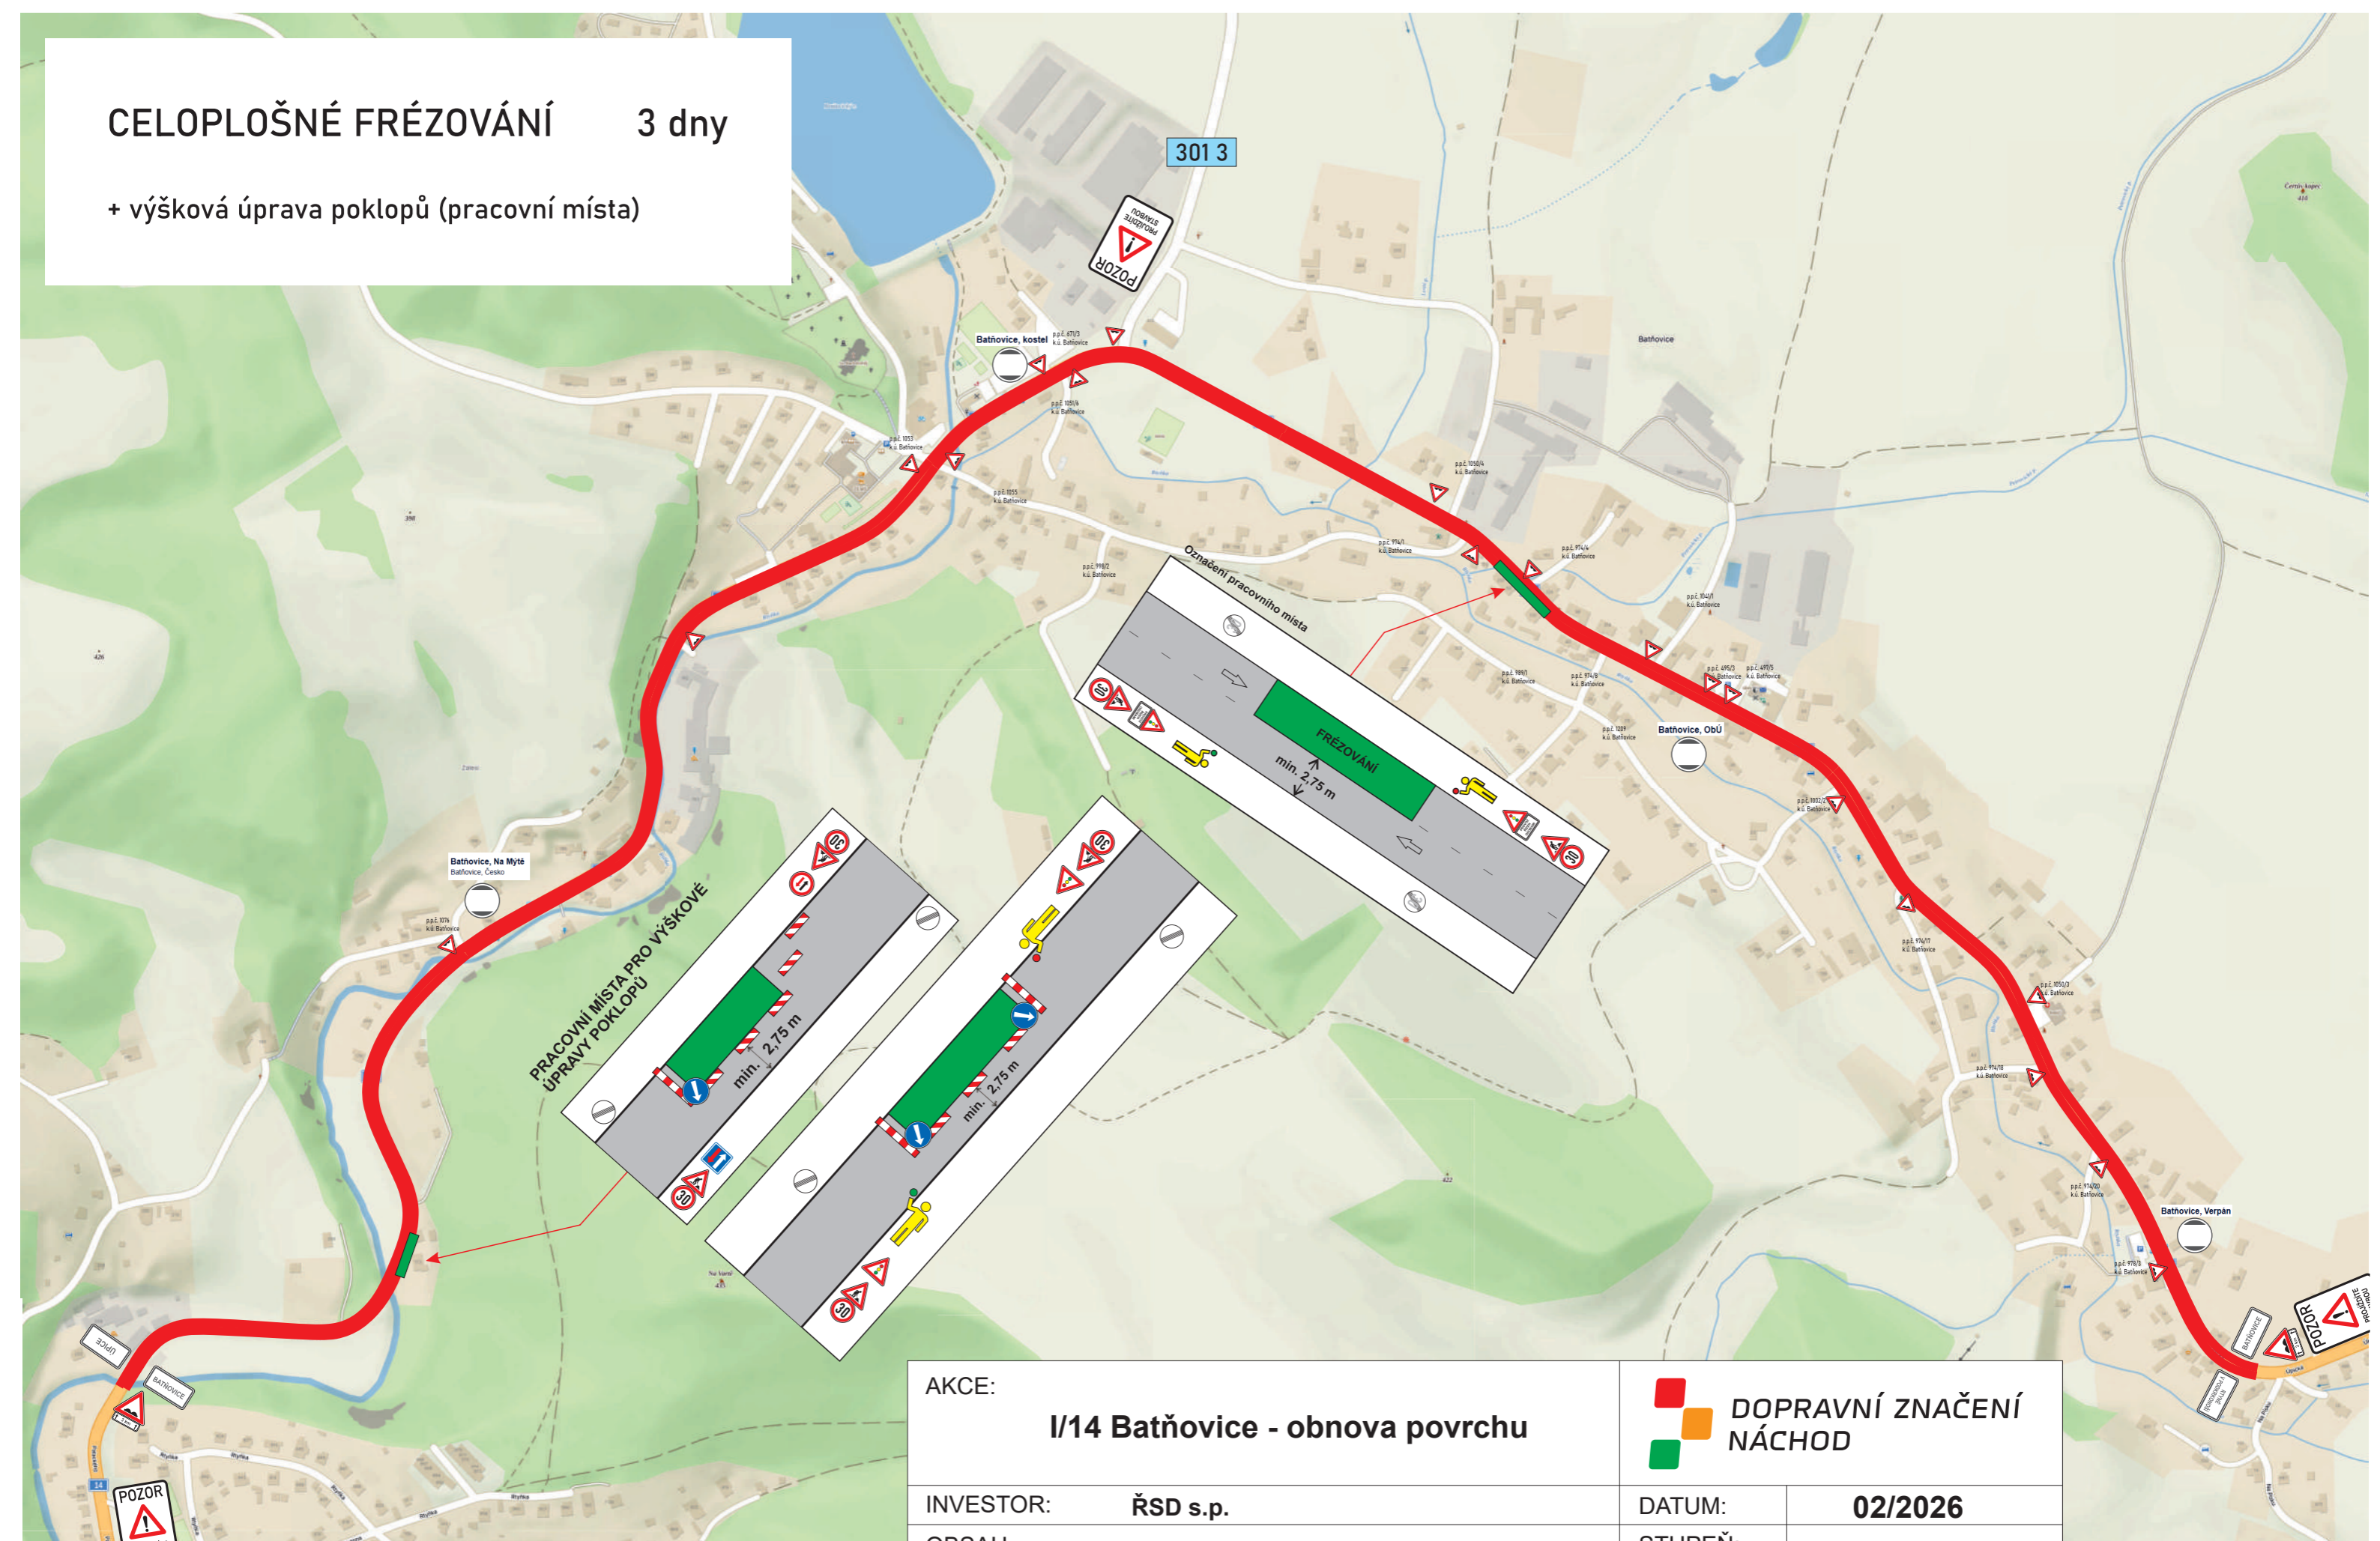


SITUACE PDZ č. 9

AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:		02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			

SANACE (pracovní místa)

3 dny

+ výšková úprava poklopů (pracovní místa)

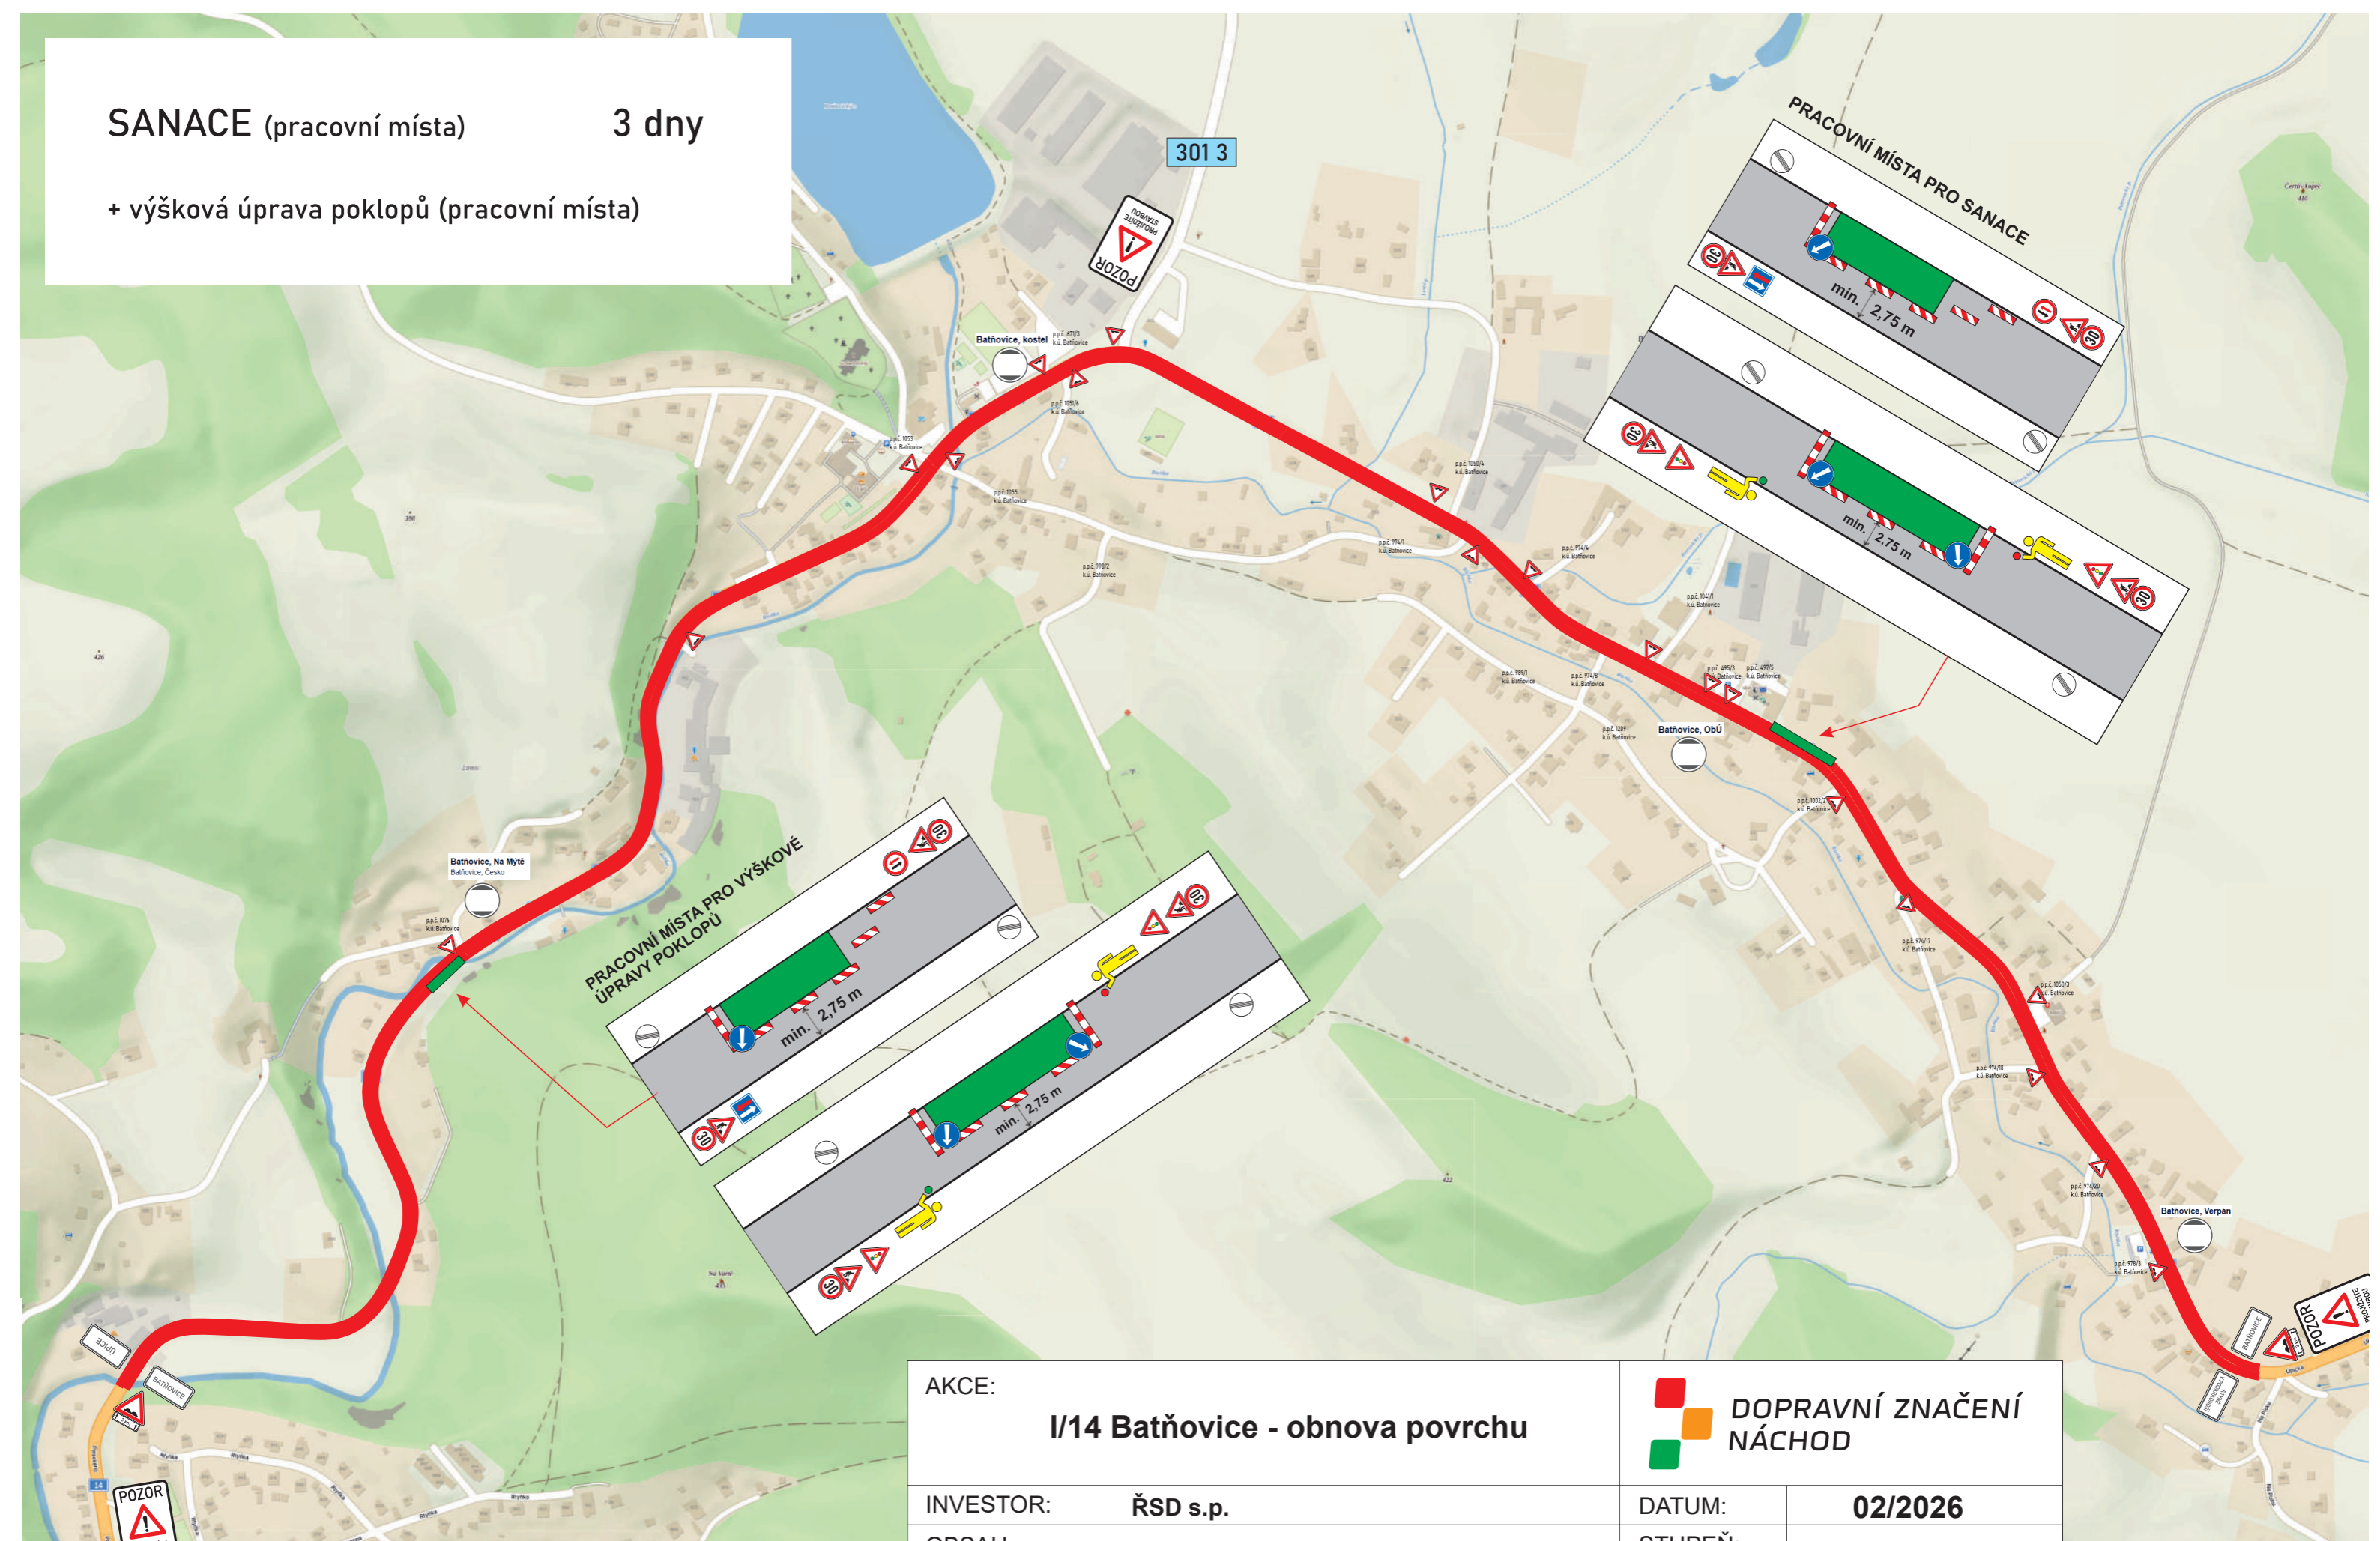


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu			
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:		02/2026
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			

SITUACE PDZ č. 10


POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV 12 dnů

pokládka bude provedena po úsecích (1L - 5P)
(situace PDZ stejné jako situace č. 2 - 7)

+ výšková úprava poklopů (pracovní místa)

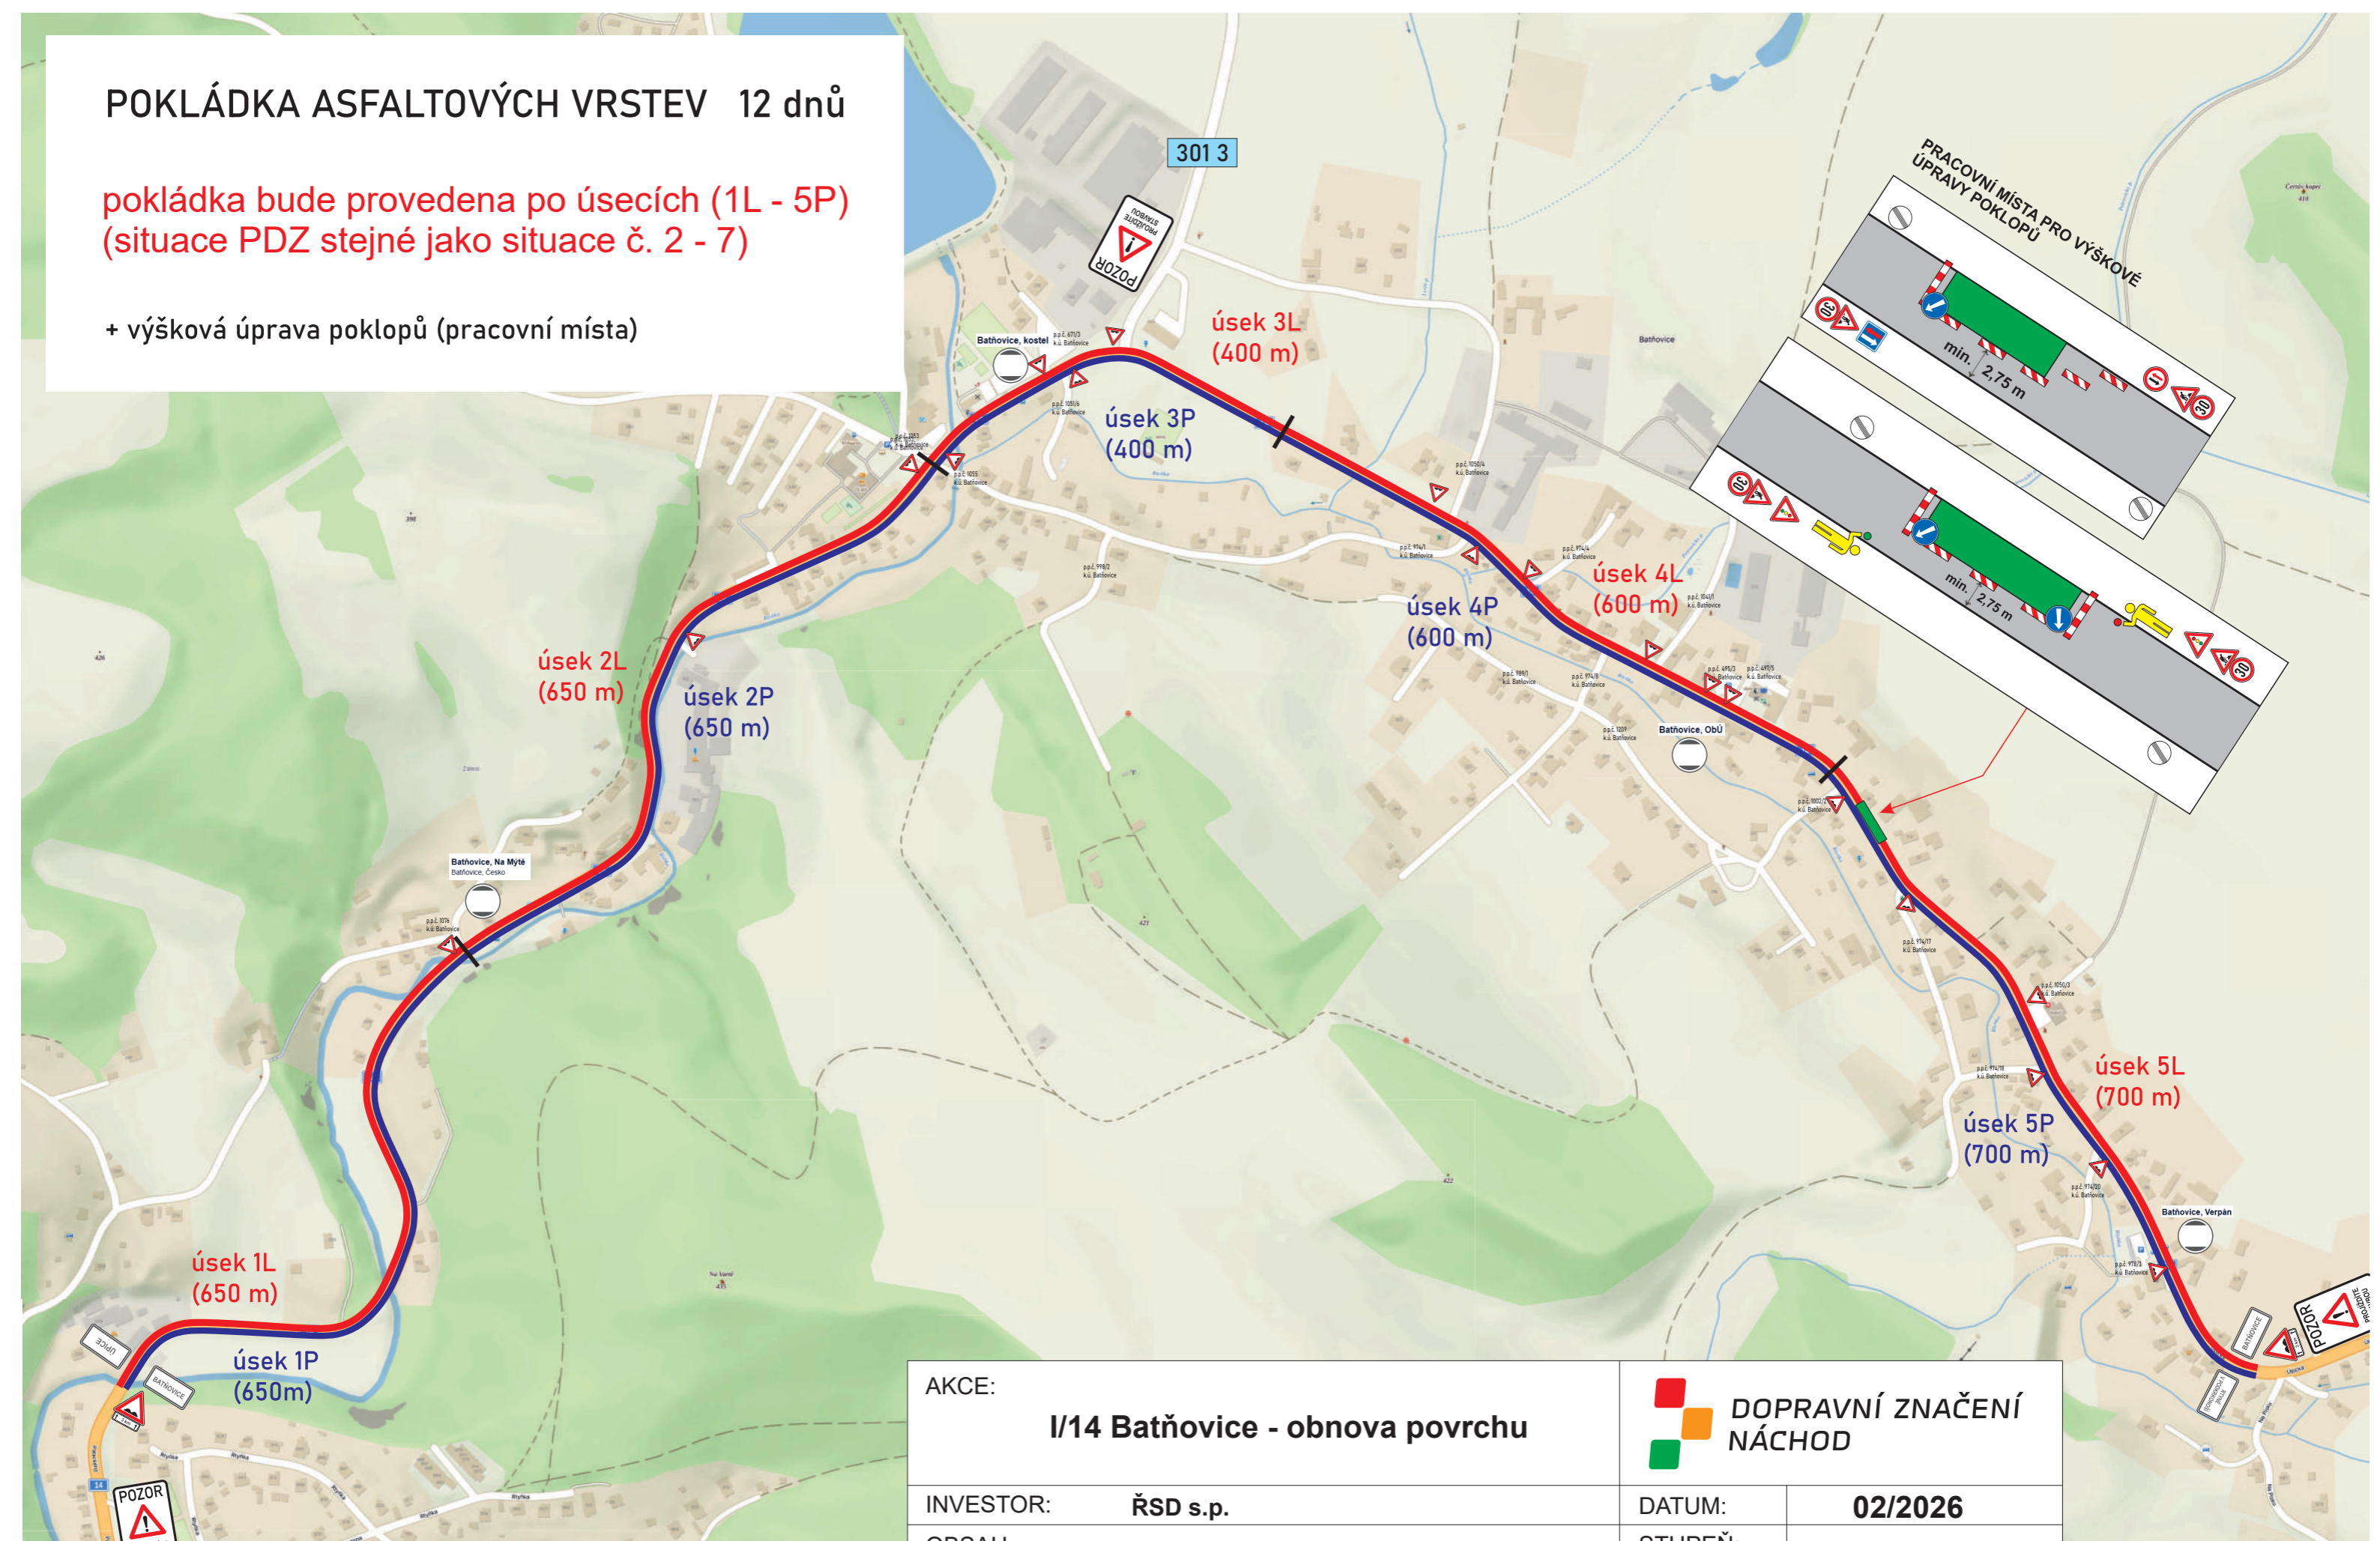


SITUACE PDZ č. 11

AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


PRACOVNÍ MÍSTA

3 dny

- krajnice, VDZ, dokončovací práce

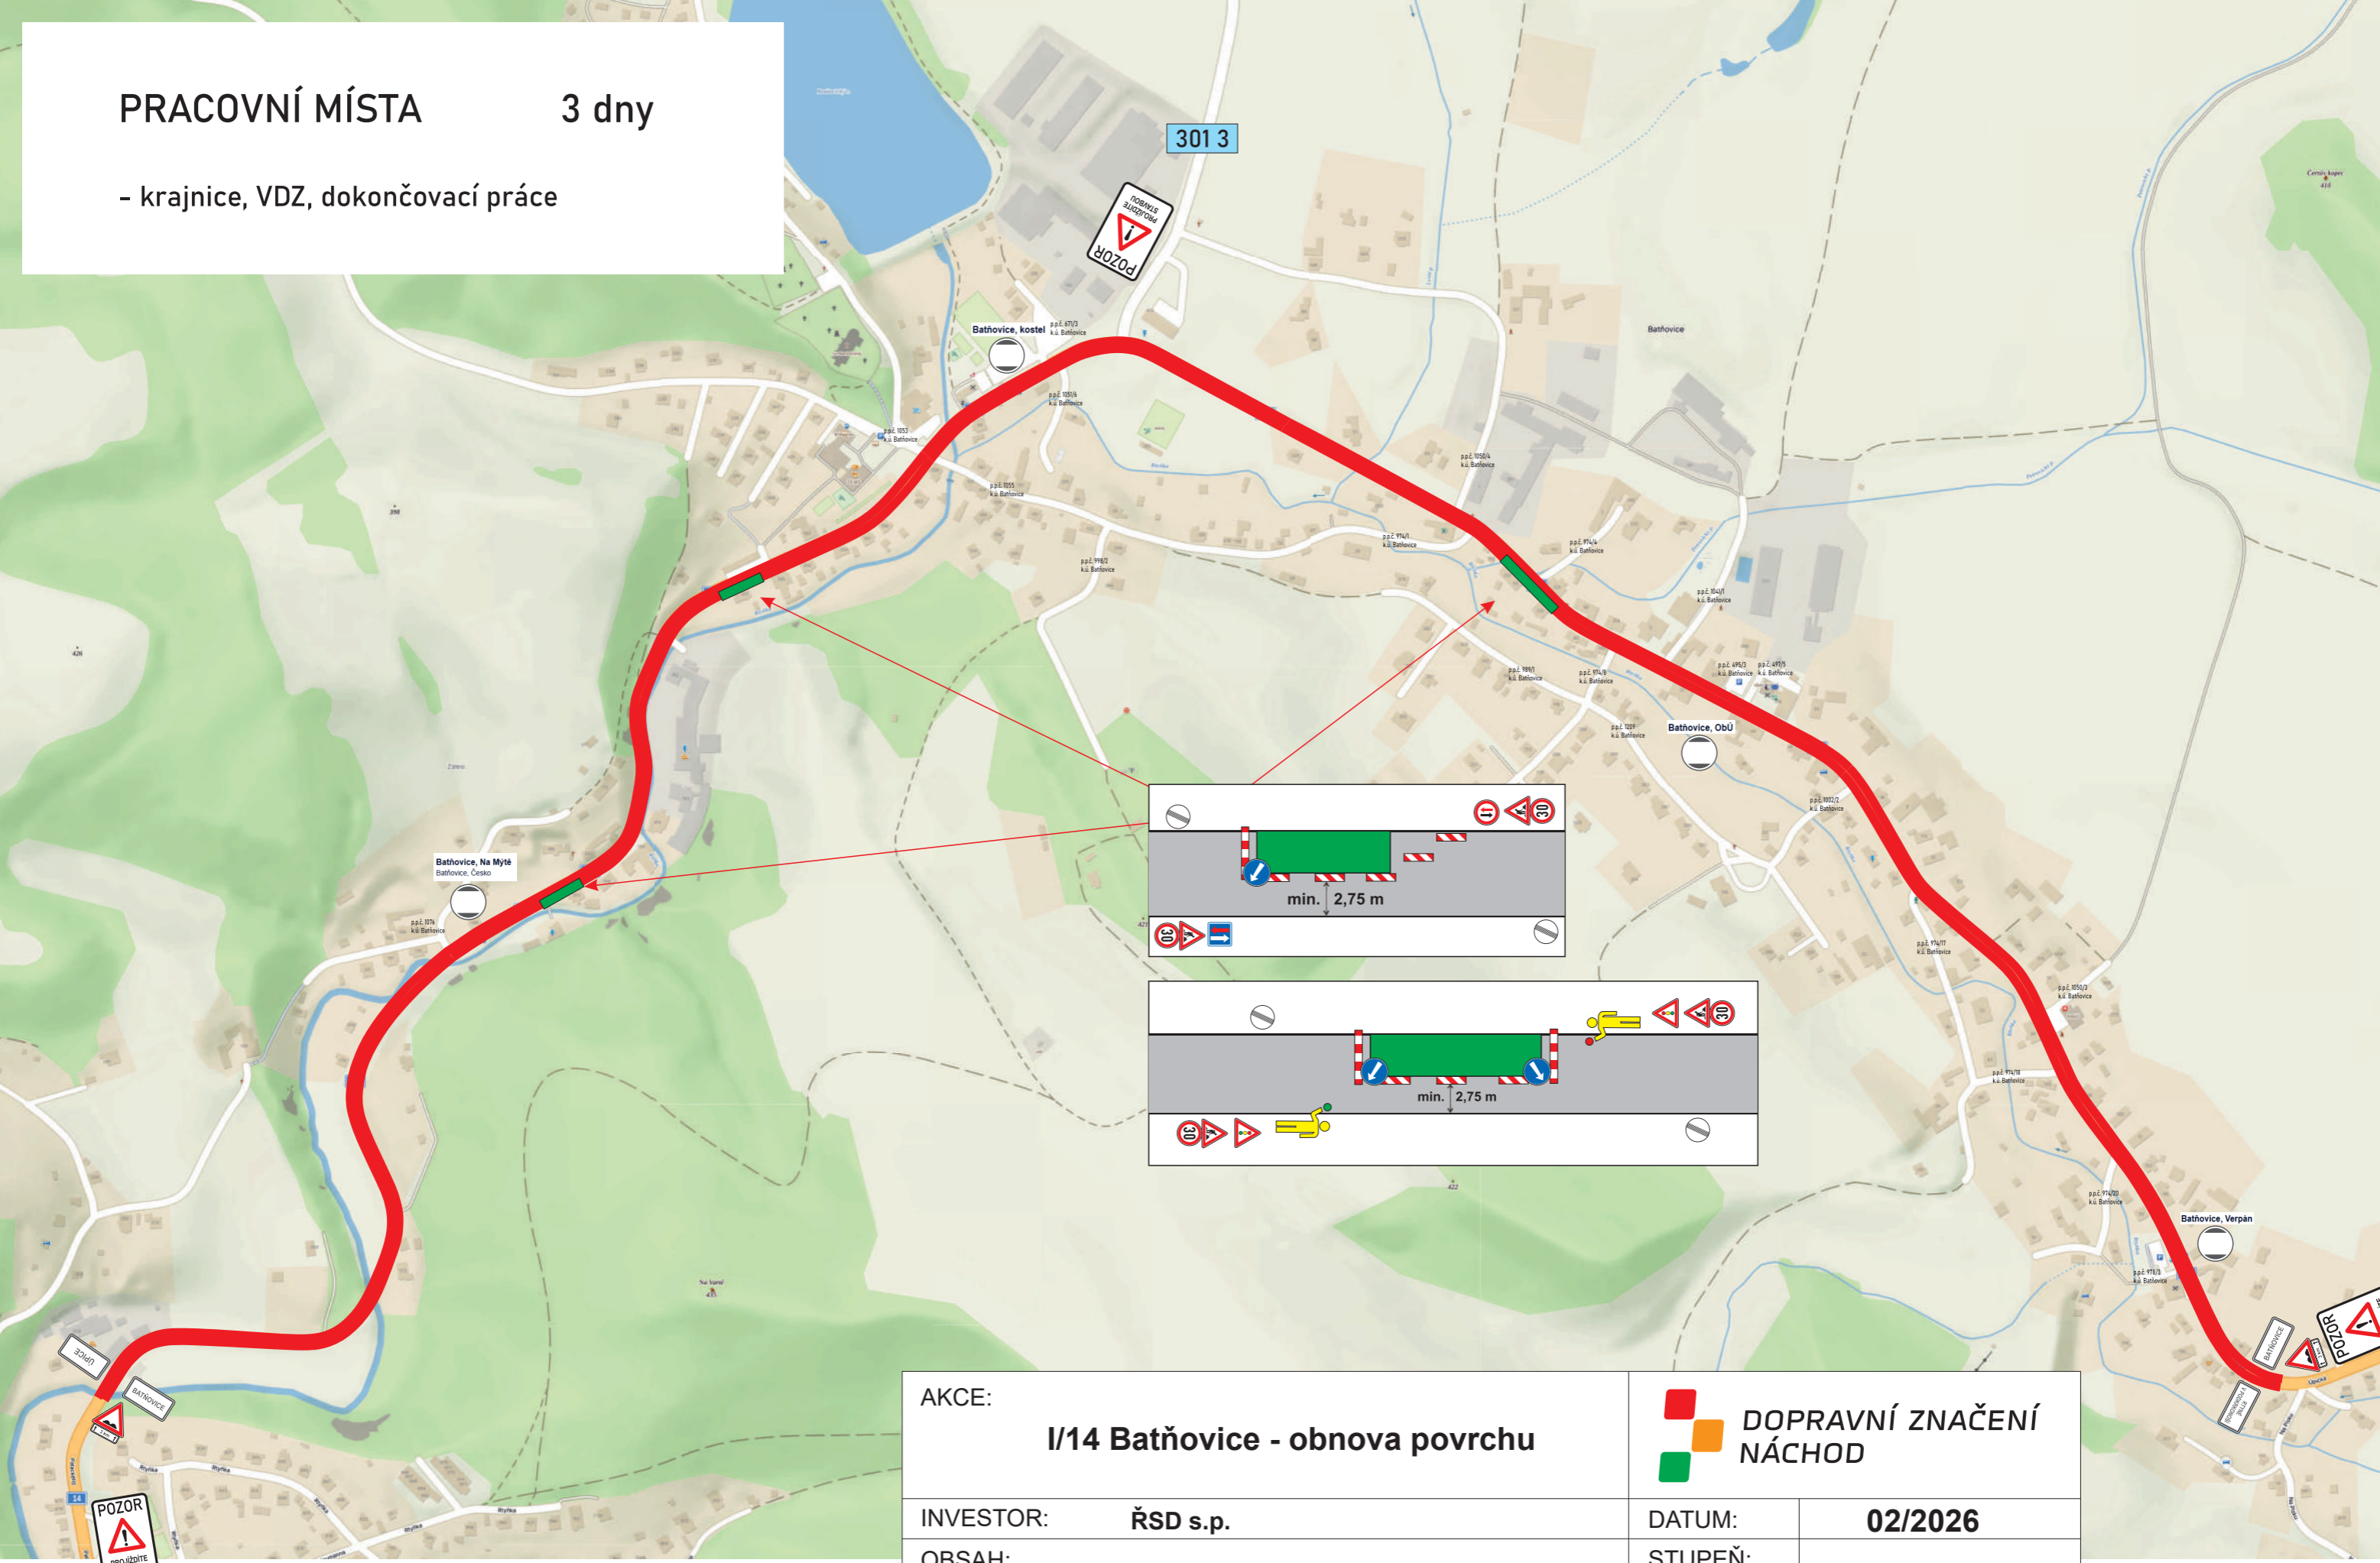

SITUACE PDZ č. 12


AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:		
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			


PRACOVNÍ MÍSTA

10 dnů

- dokončovací práce

(max. do 7.7.2026)

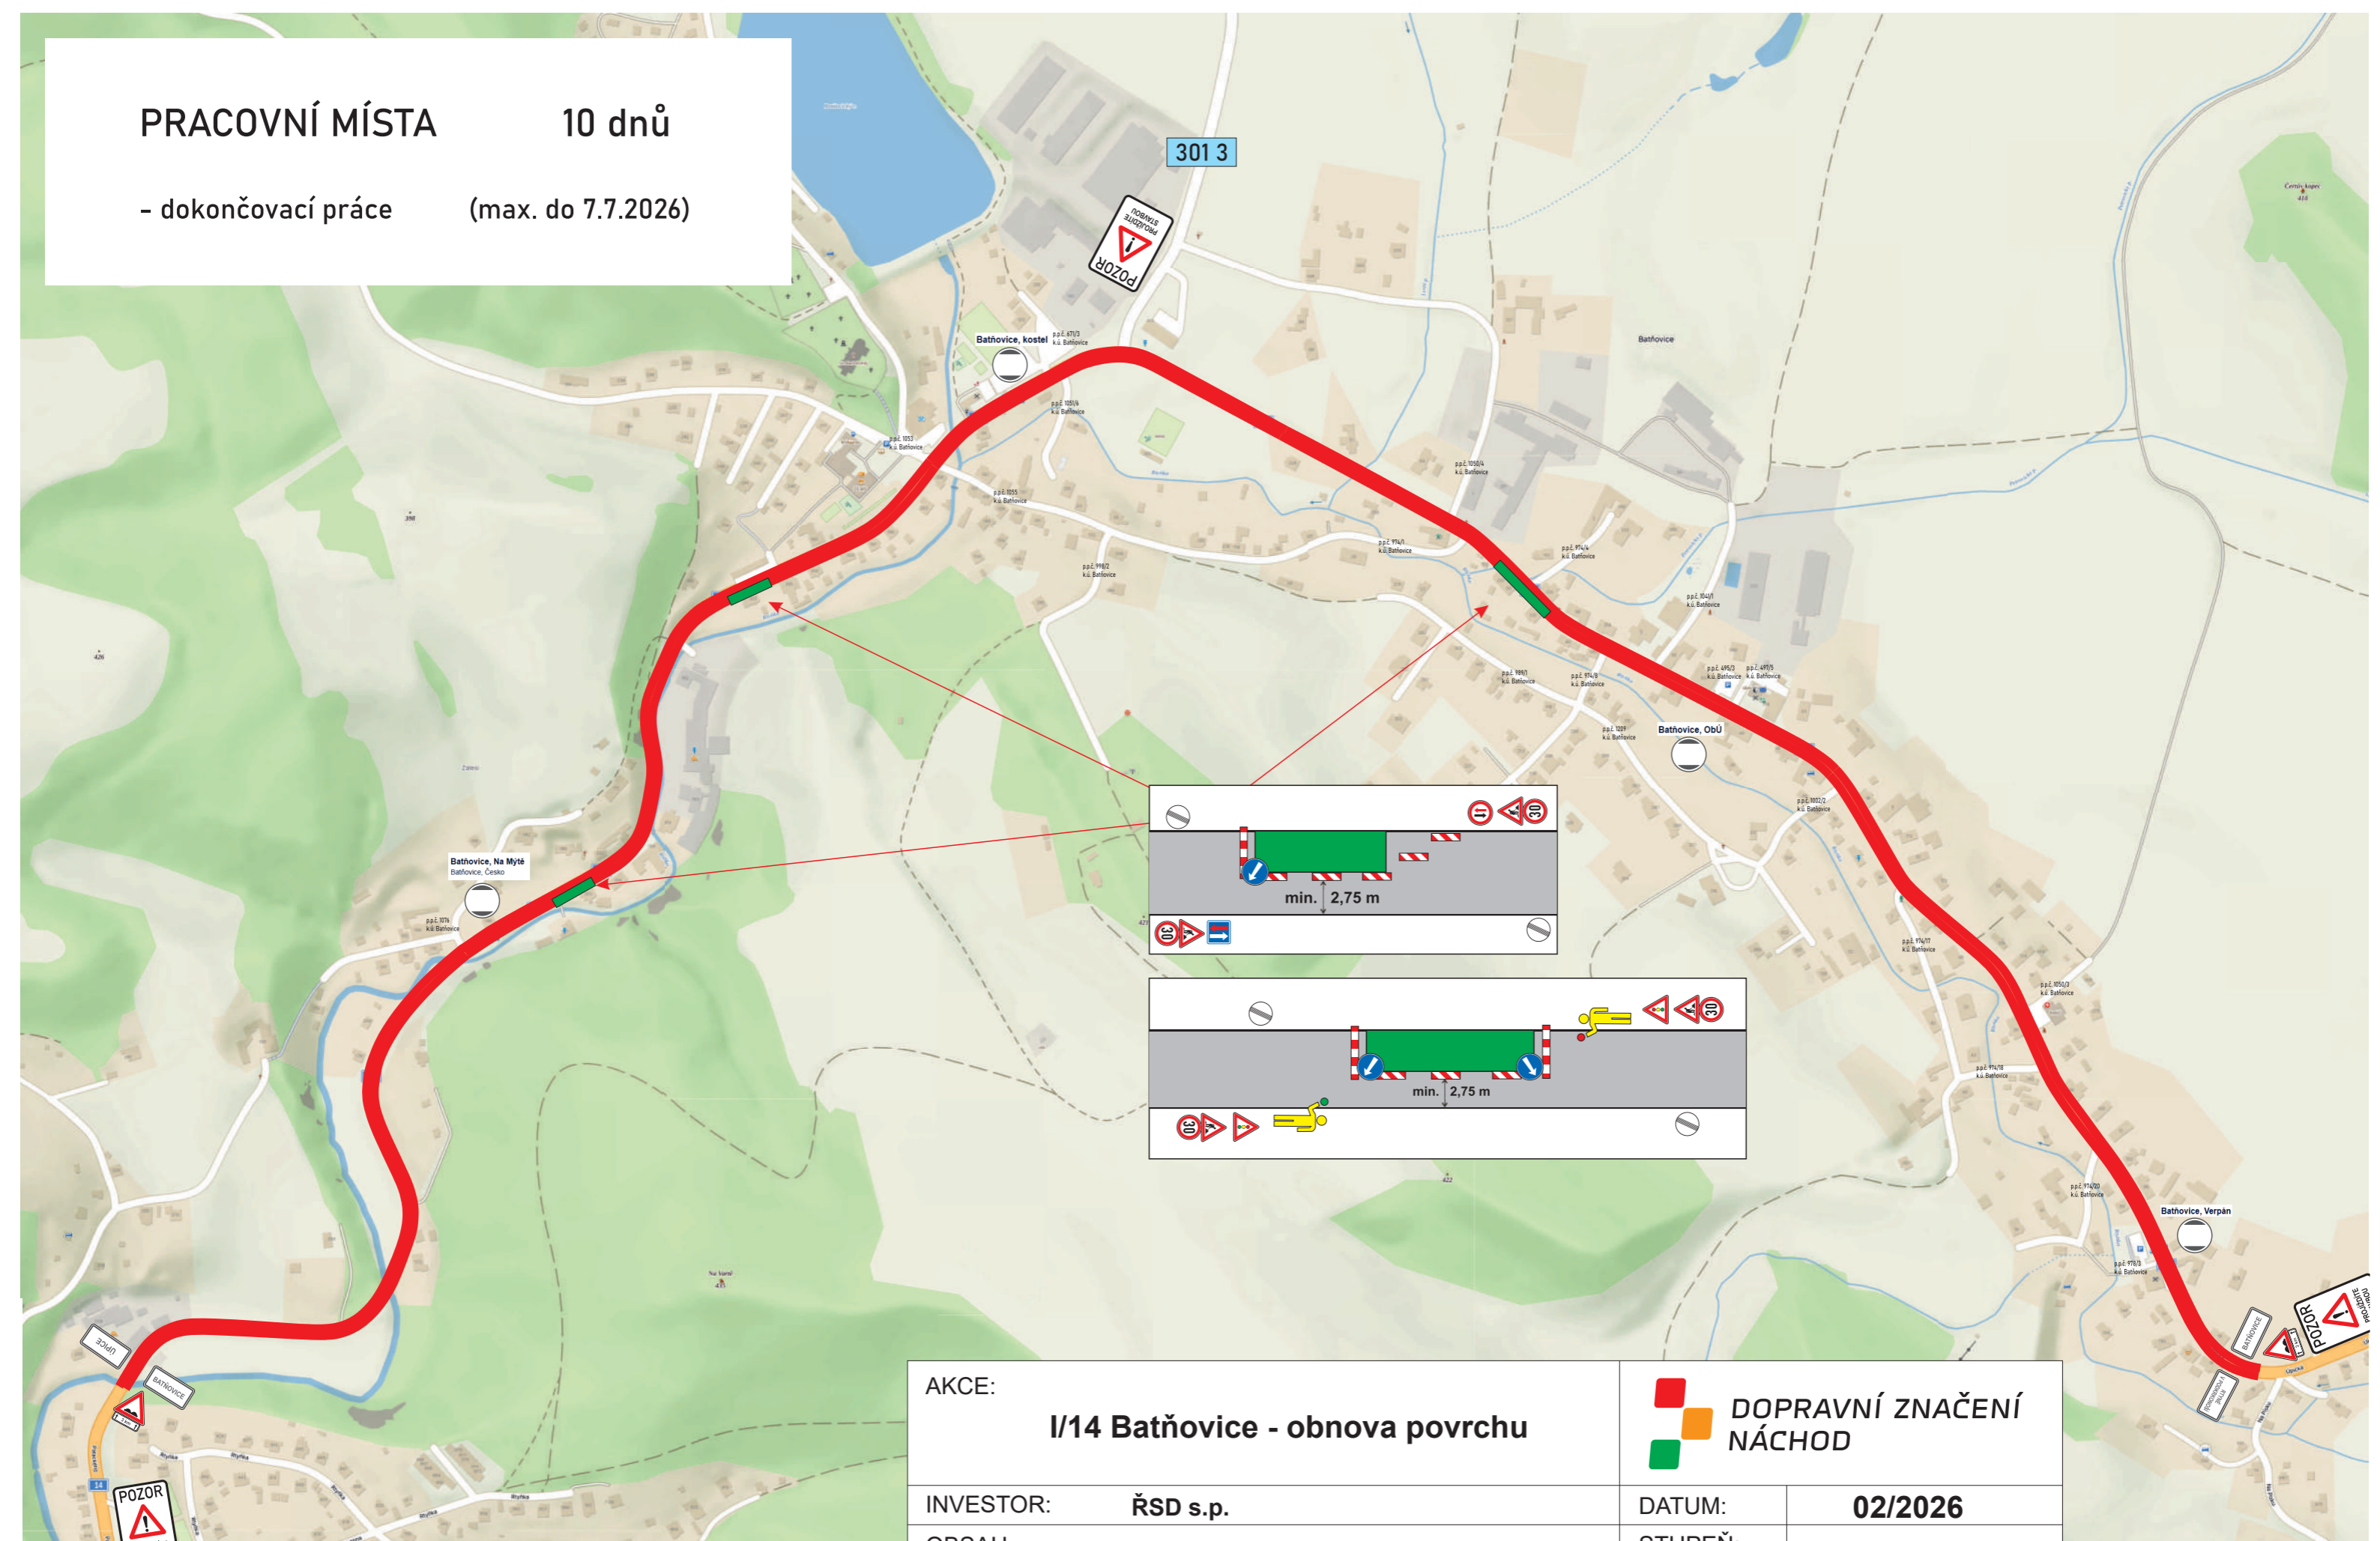

AKCE:	I/14 Batňovice - obnova povrchu		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:	ŘSD s.p.	DATUM:	02/2026	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG a.s.			

SITUACE PDZ č. 13
